

**UNIVERSIDADE DO
PORTO
REITORIA**


U. PORTO

ac arquivo
central

PASTA N.º 1120

M. H. O. P.

Direcção-Geral das
Construções Escolares
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE



U. PORTO

arquivo
central

UNIVERSIDADE DO PORTO - REITORIA

OBRAS NO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

APROVEITAMENTO DA ALA POENTE

1980

FICHA INDICADORA

Rec. Provisória	Inquérito	Auto de entrega	Conta Final	Recepção Definitiva
<p>Feito com data de 30/7/82.</p>	<p>Pedido em 26/7/83. Respondido em 28-7-83. Não houve reclamação.</p>	<p>Auto de entrega</p>	<p>Assessor</p>	<p>10/11/82</p>

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO

(Art.º 15.º do Decreto nº 41470 de 31 de Dezembro)

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DUPLICADO

Ano económico de 1981


1981
Guia de depósito n.º 1390

Escudos 3 900 \$ 00

Paqueta
Paqueta

Vai o Tesoureiro de Obras Públicas, José Ferreira dos Reis, depositar na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, a quantia de Três mil e novecentos escudos proveniente do desconto de 5 % efectuado na folha n.º 4382 da Direcção-Geral das Construções Escolares para reforço do depósito n.º de garantia da empreitada de " Universidade do Porto Ob. no Serv. de Contabilidade Aproveitamento da Ala Poente " adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda pelo contrato n.º 569/81 / , de 7 de Maio de 1981 depósito esse feito por ordem ~~da~~ e á ordem da Direcção de Serviços Regionais de Construções Escolares do Norte , sita em Rua Júlio Dinis, 826-Porto entidade a quem deve ser enviado o respectivo conhecimento.

Lisboa, 27 de Agosto de 1981



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPÓSITOS

GRUPO 1. DEPÓSITOS OBRIGATORIOS

Certificação do Precatório Obrigatório N.º 385605

recebido em 24. SET. 1981

no dia _____ de _____ de 197 _____.

Lisboa, 6. OUT. 1981 de 197 _____.

Conjuri

O Chefe da 1.ª Secção

Averbamentos dos precatórios sobre o depósito

MUITO IMPORTANTE
NO PRECATÓRIO DEVERÁ INDICAR
SE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO
DEPÓSITO: 24. SET. 1981

ac arquivo
central

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Direcção-Geral das Construções Escolares
 Direcção dos Serviços de Administração
 Repartição dos Serviços Administrativos

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO

(Art.º 15.º do Decreto n.º 694/70, de 31 de Dezembro)
 Ano económico de 1980....

Guia de depósito n.º.....3058.....


Escudos.....20 000.....5 00

2313

Vai o Tesoureiro de Obras Públicas, José Ferreira dos Reis, depositar na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, a quantia de vinte mil escudos..... proveniente do desconto de 5 % efectuado na folha n.º 5794..... de Direcção-Geral das Construções Escolares para reforço do depósito n.º de garantia da empreitada de " Universidade da Santa-Flávia da Universidade Serviço de Contabilidade" adjudicada a David Perreira Nunes & Filhos, Lda pelo contrato n.º de de 19 .. depósito esse feito por ordem e à ordem da Direcção de Serviços Regionais de Construções Escolares do Norte site em Rua João Dinis, 826-Porto entidade a quem deve ser enviado o respectivo conhecimento.

Lisboa, 29 de Dezembro de 19 80

U/Chefe da Repartição



CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEPÓSITOS

DSD I. DEPÓSITOS OBRIGATORIOS

Conferência do Depósito Obrigatório N.º 385512

recorrido num cope de LISBOA

no dia de 28 JAN 1981 de 197

Lisboa, de -5.FEV.1981 de 197

Conferi

O Chefe da 1.ª Secção

Averbamentos dos precatórios sobre o depósito

MUITO IMPORTANTE

NO PRECATÓRIO DEVERÁ INDICAR-
-SE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO
DEPÓSITO: 28 JAN 1981

U. PORTO

ac

arquivo
central



Exm^o Senhor

Director do Banco Borges & Irmão

Rua Sá da Bandeira, 20

4000 PORTO

27 JUL 1986

Sua referência

Sua comunicação de

Nessa referência nº 7718
Ofício n.º

Rua Júlio Diniz, 826, 4.º - Telef. 691815/691838
4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO. "Fiança de esc. 23 900\$00"

U. PORTO

arquivo
central

Solicito a V. Ex^a se digne mandar cancelar a fiança
n.º de Esc: 23 900\$00 . respeitante ao depósito
definitivo , da Empreitada de "Obras no Serviço de Contabili-
dade-Aproveitamento da Ala Poente da Fac. de Ciências da U.P.
" adjudicada a David Pereira Nunes & F^os, Ld^o.

Com os melhores cumprimentos.

ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)



À Firma

David Pereira Nunes & Filhos, Lda

Rua do Araújo, 1299 (Leça do Balio)

4465 S. MAMEDE DE INFESTA

27 DEZ. 1985

Sua referência

Sua comunicação de

Nessa referência
Ofício n.º

7695

Rua Júlio Dinis, 826, 4.º - Telef. 691815/691838
4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO: "Universidade do Porto - Obras no Serviço de
Contabilidade - Aproveitamento da Ala Poente"

U. PORTO

ac arquivo
central

Junto remeto a V. Ex^{as} 1 precatório-cheque na impor-
tância de Esc: 23 900\$00 , respeitante aos décimos de garan-
tia, retidos na empreitada em epígrafe.

Devem V.S^{as} acusar a recepção deste documento.

Ø ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

A

David Pereira Nunes & Filhos, Lda
Rua do Araújo, 1 299 (Leça do Balio)
4 465 S. MAMEDE DE INFESTA

OFICIO 7507 20. Dez. 1925

"Obras do Serviço de Contabilidade - Aproveitamento da
Ala Poente (Faculdade de Ciências)"

U. PORTO

arquivo
central

A fim de se proceder ao levantamento dos décimos retidos
na empreitada em epígrafe, solicito a V. Ex^{as} o envio a esta Direcção,
dos seguintes elementos:

- 1 precatório cheque-azul;
- 1 selo fiscal 72\$00.

O DIRECTOR DE SERVIÇOS

(Júlio Amaral de Carvalho)

CM

MC/



16/12

À Firma
 David Pereira Nunes & Filhos, Lda
 Rua do Araujo, 1299
 4465 S. MAMEDE INFESTA

15. DEZ. 1983

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
 Ofício n.º

7432

Rua João Diogo, 826, 4.ª - Telef. 691815/691839
 4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO:

"Universidade do Porto - Obras do Serviço de Contabilidade - Aproveitamento da Ala Foente (Faculdade de Ciências)"

Para arquivo de V.Sas. junto se envia um exemplar do auto de recepção definitiva, da empreitada em epigrafe.

Com os melhores cumprimentos.

o Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.

Por cancelamento ficam
 u elementos

Arquivar

19-12-83



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
DIRECCÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
S. R. DIRECCÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

A consideração do Sr. Engenheiro,
Director ~~de~~ *geral*
Não houve reclamações no
inquérito administrativo.

Porto, 17/11/83

O Eng. Director

Julio Augusto de Carvalho

APROVO

Por delegação da Sua Excelência o
Secretário de Estado das Obras Públicas

7/12/83

O SUBDIRECTOR GERAL

A. Louza Viana

A. LOUZA VIANA

13/12/83

Fepo de António Gama

Manuel Machado Espregueira

7/12/83

AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE "Universidade do Porto-Obras
no Serviço de Contabilidade-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de
Ciências)"

ADJUDICADA A *David Pereira Nunes & Filhos, Lda*

PELO CONTRATO N.º 569/81

DE *sete* DE *Maio* DE MIL NOVECENTOS E *oitenta e um*

VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM *vinte e dois*

DE *Maio* DE MIL NOVECENTOS E *oitenta e um*

PELA IMPORTÂNCIA DE *quatrocentos setenta e oito mil escudos*

(478.000 \$ 00)

Aos *dez* dias do mês de *Novembro* de mil novecentos e

oitenta e três, compareceram no local da obra os Engenheiro Director

dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, *Julio Augusto do*

Amaral Teixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe de Divisão de Obras, *Manuel*

Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, *Fernando de Pinho Nunes*

que constituem a comissão de Recepção da empreitada em referência, nomeada de
harmonia com o despacho ministerial de *30* de *Outubro* de 19 *79* para
procederem na presença do representante do adjudicatário,

aos exames de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam
de acordo com as condições estipuladas, razão porque deliberaram considerá-la em
condições de ser aceite definitivamente.

E, não havendo mais nada a tratar, foi lavrado o presente auto que vai ser
assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo
representante do adjudicatário.

Julio Augusto de Carvalho
Manuel Machado Espregueira
Fernando de Pinho Nunes
David Pereira Nunes

SECCÃO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
ENVIADA FOTOCOPIA
4628 A 622
10/12/83

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECCÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECCÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE
REPARTIÇÃO DE...
3 0 NOV. 1983
SECCÃO EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
Liv. 4 Fol. 570 N.º 11216
P.º N.º

SECCÃO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO
3 0 NOV. 1983



A consideração do Sr. Engenheiro
 Director ~~de~~ *Geral*
 Não houve reclamações no
 Inquérito administrativo.

Porto, 12/11/83

O Eng. Director
Júlio Augusto do Amaral Seixeira

10/11/83

AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE "Universidade do Porto-Obras no Serviço de Contabilidade-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"

ADJUDICADA A David Pereira Nunes & Filhos, Lda PELO CONTRATO N.º 509/81

DE sete DE Maio DE MIL NOVECENTOS E oitenta e um VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM vinte e dois DE Maio DE MIL NOVECENTOS E oitenta e um PELA IMPORTÂNCIA DE quatrocentos setenta e oito mil escudos

(478.000 \$ 00)

Aos dez dias do mês de Novembro de mil novecentos e oitenta e três, compareceram no local da obra os Engenheiro Director dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, Júlio Augusto do Amaral Seixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe de Divisão de Obras, Manuel Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, Fernando de Pinho Noites

que constituem a comissão de Recepção da empreitada em referência, nomeada de harmonia com o despacho ministerial de 30 de Outubro de 19 79 para procederem na presença do representante do adjudicatário,

aos exames de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam de acordo com as condições estipuladas, razão porque deliberaram considerá-la em condições de ser aceite definitivamente.

E, não havendo mais nada a tratar, foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo representante do adjudicatário.

Manuel Machado Espregueira
Fernando de Pinho Noites
David S. Nunes

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE.

EMPREITEIRO	Nome	<i>David Pereira Nunes & Filhos, Lda</i>
	Morada	<i>Rua do Arcaíjo, 1299 - Leça do Balio - 4465 S. Mamede Infesta</i>

Ex.^{ma} Senhor

Presidente da Comissão de Inscrição e Classificação dos Empreiteiros de Obras Públicas

Rua das Pedras Negras, 16

1100 - LISBOA

N.º Ref.:

DATA:

De acordo com o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art.º 14.º do Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40 623, de 30 de Maio de 1956, envio a V. Ex.ª o boletim de informação referente à empreitada infra.

O DIRECTOR-GERAL

BOLETIM DE INFORMAÇÃO

EMPREITADA	Designação	<i>-Empreitada de: "Universidade do Porto-Obras no Serviço de contabilidade-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"</i>				
	Custo	QUANTITATIVO DA ADJUDICAÇÃO	<i>478 000\$00</i>	CUSTO FINAL DA OBRA	<i>478 000\$00</i>	
	Datas	PRAZO INICIAL	<i>58 dias</i>		PRORROGAÇÕES	
					Sem multa	
					Com multa	
		Consignação	<i>4 / 11 / 80</i>	Recepção provisória	<i>30 / 7 / 82</i>	Recepção definitiva
Síntese	MAU <input type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	MUITO BOM <input type="checkbox"/>		
Técnicos Responsáveis	Nome		Categoria			
	_____		_____			

VISTO

O CHEFE DE DIVISÃO

Manuel Machado Espregueira

VISTO

O DIRECTOR DOS SERVIÇOS

John A. S. Gomes

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES A EXECUÇÃO DA OBRA

1	ANDAMENTO PROGRESSIVO DOS TRABALHOS	<i>Bom</i>		
2	SUSPENSÕES E INTERRUPTÕES	<i>Nenhumas</i>		
3	PRORROGAÇÕES E JUSTIFICAÇÕES	<i>Nenhumas</i>		
4	COMPORTAMENTO TÉCNICO	<i>Bom</i>		
5	COMPORTAMENTO MORAL	<i>Bom</i>		
6	CAPACIDADE FINANCEIRA	<i>Bom</i>		
7	RELAÇÕES COM A FISCALIZAÇÃO	<i>Boas</i>		
8	INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E RECLAMAÇÕES APRESENTADAS	<i>Não foi apresentada qualquer reclamação.</i>		
9	ACIDENTES PESSOAIS E MATERIAIS	_____		
10	EQUIPAMENTO ESPECIAL UTILIZADO	DESIGNAÇÃO <i>Foi utilizado o equipamento mecânico necessário e suficiente à boa execução e dinamização da empreitada.</i>	ESTADO <i>usado</i>	PRÓPRIO ALUGADO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>Incluir com X</small>
11	DIVERSOS	_____		

Em 10 de Novembro de 19 83.

O TÉCNICO FISCAL

Leuand & Pmb Nte

EMPREITEIRO	Declaro que tomei conhecimento desta informação	
	Em 14 de Novembro de 19 83	O EMPREITEIRO <i>David P. Nery</i>

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

[Handwritten signature]

João Manuel da Silva Henriques

O ADJUDICATÁRIO

David P. Nunes

Observações

CONTA FINAL da obra de: União do Porto - Obras na secção de contabilidade - Aprovaç. de ala pariete (Fac. Ciências)
Adjudicatário: David Pereira Nunes e Filhos, Lda
Contrato n.º 569/81 de 22 de Maio de 1981
de Esc. 478 000 \$ 00

Importância do contrato	\$
Trabalhos imprevistos	\$
Indemnizações	\$
Obras complementares	\$
<hr/>	
TOTAL DA ADJUDICAÇÃO	\$

Importância total dos orçamentos				
a) - do projecto			\$	
b) - de imprevistos			\$	
c) - de indemnizações			\$	
d) - de obras complementares			\$	
Correspondentes importâncias de correcção de praça:				\$
a) - _____	\$		\$	
b) - _____	\$		\$	
c) - _____	\$		\$	
d) - _____	\$		\$	
Total de adjudicação	\$		\$	\$
DOCUMENTAÇÃO				
Importância líquida paga ao adjudicatário			451 710 \$ 00	
Importâncias pagas pelo adjudicatário por dedução nas documentações:			23 900 \$ 00	
1/2% para a caixa Geral de Aposentações	2 390 \$ 00			
_____	\$			
_____	\$			
_____	\$			
Descontos que constituem crédito do adjudicatário			\$	
Total dos trabalhos executados e documentados				478 000 \$ 00

U. PORTO

arquivo central

po-1120 : 0016

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO D

EMPREITEIRO	Nome	Francisco Pereira Neves & Filhos, Lda
	Morada	

Ex.^{ma} Senhor

Presidente da Comissão de Inscrição e Classificação dos Empreiteiros de Obras Públicas

Rua das Pedras Negras, 16

1100 - LISBOA

N.º Ref.º

DATA

De acordo com o disposto nos §§ 1.º e 2.º do art.º 14.º do Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40 623, de 30 de Maio de 1956, envio a V. Ex.ª o boletim de informação referente à empreitada infra.

O DIRECTOR-GERAL

BOLETIM DE INFORMAÇÃO

EMPREITADA	Designação	- Uteisidade do Forno - Obras no serviço de contabilidade - Aparatamento da Ala Forno (Faculdade de Ciências) 4				
	Custo	QUANTITATIVO DA ADJUDICAÇÃO	478.000,00	CUSTO FINAL DA OBRA	478.000,00	
	PRAZO INICIAL	(com o prazo de 58 dias)		PRORROGAÇÕES:	Som multa _____ Com multa _____	
	Consignação	4.11.80	Recepção provisória	30/7/82	Recepção definitiva	1/1/82
	Síntese	MAU <input type="checkbox"/>	REGULAR <input type="checkbox"/>	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	MUITO BOM <input type="checkbox"/>	Indicar com X
Técnicos Responsáveis	Nome		Categoria			

VISTO

O CHEFE DE DIVISÃO

VISTO

O DIRECTOR DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES A EXECUÇÃO DA OBRA

1	ANDAMENTO PROGRESSIVO DOS TRABALHOS	<i>Bom</i>		
2	SUSPENSÕES E INTERRUPTÕES	<i>Nenhuma</i>		
3	PRORROGAÇÕES E JUSTIFICAÇÕES	<i>Nenhuma</i>		
4	COMPORTAMENTO TÉCNICO	<i>Bom</i>		
5	COMPORTAMENTO MORAL	<i>Bom</i>		
6	CAPACIDADE FINANCEIRA	<i>Boa</i>		
7	RELAÇÕES COM A FISCALIZAÇÃO	<i>Boas</i>		
8	INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E RECLAMAÇÕES APRESENTADAS	<i>Não foi apresentada qualquer reclamação</i>		
9	ACIDENTES PESSOAIS E MATERIAIS	<i>—</i>		
10	EQUIPAMENTO ESPECIAL UTILIZADO	DESIGNAÇÃO <i>Foi utilizado o equipamento mecânico necessário e suficiente à boa execução e diminuição da despesa.</i>	ESTADO <i>usado</i>	PRÓPRIO <input checked="" type="checkbox"/> ALUGADO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>Indicar com X</small>
11	DIVERSOS	<i>—</i>		
		Em	de	de 19
		O TÉCNICO FISCAL		

EMPREITEIRO	Declaro que tomei conhecimento desta informação			
	Em	de	de 19	O EMPREITEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
D. S. C. C.
Repartição Administrativa Ocidental
Rua de Cedofeita, 439-1.º
Tel. 22726

S.  R.

5/9/83
S. E. G. P.
Gouveia

Administração do 2.º Bairro (Occidental) do Porto

Rua de Cedofeita, 439 - 1.º - Telef. 22726 - 4000 PORTO

Exmº Sr.

Engº Director das Construções Es-
colares do Norte
Rua Júlio Dinis, 826-4º
4000 Porto

s/ referência
Ofº nº 4403 de 26 / 7 / 1983

PORTO, 30/8 / 1983

n/ referência
N.º 1002/P-1 L.º 1

P.º N.º 37/83

ASSUNTO: INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Referindo-me ao ofício de V. Exª acima indicado, in-
cluso envio um exemplar do edital devidamente certificado quanto à
sua afixação, e uma certidão comprovativa de não ter sido apresen-
tada qualquer reclamação por falta de pagamento de jornais, mate-
riais ou outras indemnizações e preço de trabalhos que o empreitei-
ro haja mandado executar por terceiros tudo respeitante à empreita-
da de "UNIVERSIDADE DO PORTO- OBRAS NO SERVIÇO DE CONTABILIDADE - A-
PROVEITAMENTO DA ALA POENTE (FACULDADE DE CIÊNCIAS)", adjudicada a
David Pereira Nunes & Filhos, Lda., com sede na Rua de Araújo, nº
1299, Leça do Balio, S. Manede de Infesta.

Com os melhores cumprimentos,
O Chefe da Repartição Administrativa Oriental, em substituição,

Manuel



INQUÉRITO ADMINISTRATIVOEDITOS DE 20 DIAS

ARMÉNIO DE MORAIS ALÃO, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e Chefe da Repartição Administrativa Ocidental da Câmara Municipal do Porto:

Faz saber, por delegação, nos termos do artº 198º do Decreto-Lei nº 48 871, de 19 de Fevereiro de 1969, que achando-se pendente nesta Repartição Administrativa um processo de inquérito administrativo respeitante à empreitada de "UNIVERSIDADE DO PORTO - OBRAS NO SERVIÇO DE CONTABILIDADE - APROVEITAMENTO DA ALA POENTE (FACULDADE DE CIÊNCIAS)", adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda., com sede na Rua de Araújo, 1 299 - Leça do Balio - S. Mamede de Infesta, correm editos de 20 dias contados da data da sua afixação, chamando todos os interessados para, até 10 dias depois do termo do prazo dos editos, apresentarem na referida Repartição, por escrito e devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou indemnizações a que se julguem com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros.

Para constar se fez este edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares do costume.

Ressalvo as rasuras das palavras: "apresentarem , prazo e empreiteiro".

Porto e Repartição Administrativa Ocidental da Câmara Municipal, 28 de Julho de 1983.

E eu, *Teusa de Jesus Brito Mendes Neto*, 3º Oficial, o subscrevi.

Afixei o presente edital

em 29/07/1983

O Oficial de diligências,

Adão Silva

Certidão

Certifico e dou fé, que no dia vinte e nove do mês junho, afixo no atilho desta Repartição, no local da obra, e na junta da frequência onde está situada a mesma obra, editais iguais ao presente.

Dais certifico que o edital afixado no atilho desta Repartição, esteve patente ao público durante vinte dias.

Por ser verdade, passo o presente que vou assinar.

Porto e Repartição Administrativa Occidental,
19 de Agosto, de 1983.

O Oficial de diligências,
Adão Silva



----- C E R T I D ã O -----

----- TERESA DE JESUS BRITO MENDES NETO, 3º Oficial da Reparti-
ção Administrativa Ocidental da Câmara Municipal do Porto: -----

----- Certifico, em face do processo de inquérito administrativo
respeitante à empreitada de "UNIVERSIDADE DO PORTO - OBRAS NO SER-
VIÇO DE CONTABILIDADE - APROVEITAMENTO DA ALA POENTE (FACULDADE DE
CIÊNCIAS)", instaurado em devido tempo nesta repartição, que duran-
te o prazo marcado pelo edital de 28 do passado mês de Julho e afixado a 29 do mesmo mês, não foi apresentada qualquer reclamação
por falta de pagamento de ordenados, salários e materiais ou indenizações e preço de trabalhos que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros, tudo com referência à aludida empreitada, adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda., com sede na rua de
Araújo, 1299 - Leça do Balio - S. Mamede de Infesta. -----

----- Por ser verdade passo a presente certidão que vou assinar
e fazer autenticar. -----

Porto e repartição Administrativa Ocidental, 30 de Agosto de 1983.

O 3º Oficial,

Teresa de Jesus Brito Mendes Neto



À Firma

David Pereira Nunes & Filhos, Lda
Rua do Araujo, 1299
Leça do Balio
4465 S. Mamede de Infesta

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
Ofício n.º

-5. SET. 1965
Rua Júlio Dinis, 826, 4.º - Telef. 691815/691838
4000 PORTO - Portugal

ASSUNTO: "Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade -
Aproveitamento da ala Poente (Faculdade de Ciências)"

U. PORTO

arquivo
central

Para arquivo de V. Ex^{as}. junto se envia um
exemplar do auto de recepção provisória, da empreitada em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos.

○ ENGENHEIRO DIRECTOR,

(Júlio Amaral de Carvalho)



29/83
 Secção de Depósito
 Geral o Pessoal
 e laudo

Ação do Sr. Engenheiro
 Director

Yera P
Júlio Augusto

APROVO
 31/8/83
 D. GERAL

A. Macedo Gonçalves

M. P. P.

25 8 83

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE "Universidade do Porto- Obras no Serviço de Contabilidade- Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências"

ADJUDICADA A David Pereira Nunes & Filhos, Lda PELO CONTRATO N.º 569/81

DE sete DE Maio DE MIL NOVECENTOS E oitenta e um VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM vinte e dois DE Maio DE MIL NOVECENTOS E oitenta e um PELA IMPORTÂNCIA DE quatrocentos setenta e oito mil escudos

(478 000 \$ 00)

Aos trinta dias do mês de Julho de mil novecentos e oitenta e dois, compareceram no local da obra os Engenheiro Director dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe de Divisão de Obras, Manuel Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, Fernando de Pinho Noites

que constituem a Comissão de Recepção da empreitada em referência, nomeada por despacho ministerial de trinta de Outubro de 1979, para procederem, na presença do representante do adjudicatário, ao exame de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam de harmonia com as condições estipuladas, deliberaram considerá-los em condições de ser aceites provisoriamente.

E nada mais havendo a tratar foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo representante adjudicatário.

ABRIL 1983
 1983

SECÇÃO DE EXPEDIENTE, GERAL E ARQUIVO
 31 AUG. 1983

Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho
Manuel Machado Espregueira
Fernando de Pinho Noites
David Pereira Nunes & Filhos

2 SET 1983
 N.º Proc.
 3 506 747



A consideração do Sr. Engenheiro
Director ~~_____~~ *geral*

a) *Manuel Machado Espregueira*

Machado

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE "Universidade do Porto- Obras no Serviço de Contabilidade- Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências"

ADJUDICADA A David Pereira Nunes & Filhos, Lda

PELO CONTRATO N.º 569/81

DE sete DE Maio DE MIL NOVECENTOS E oitenta e um

VISADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM vinte e dois

DE Maio DE MIL NOVECENTOS E oitenta e um

PELA IMPORTÂNCIA DE quatrocentos setenta e oito mil e oitocentos

(478 000 \$ 00)

Aos trinta dias do mês de Julho de mil novecentos e oitenta e dois, compareceram no local da obra os Engenheiro Director dos Serviços Regionais das Construções Escolares do Norte, Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho, o Engenheiro Chefe de Divisão de Obras, Manuel Machado Espregueira e o Engenheiro Civil Principal, Fernando de Pinho Noites

que constituem a Comissão de Recepção da empreitada em referência, nomeada por despacho ministerial de trinta de Outubro de 1979, para procederem, na presença do representante do adjudicatário,

ao exame de todos os trabalhos desta obra, tendo verificado que se encontravam de harmonia com as condições estipuladas, deliberaram considerá-los em condições de ser aceites provisoriamente.

É nada mais havendo a tratar foi lavrado o presente auto que vai ser assinado pelos funcionários que constituem a Comissão de Recepção e pelo representante adjudicatário.

Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho
Manuel Machado Espregueira
Fernando de Pinho Noites
David Pereira Nunes

Exmo. Senhor

Director dos Serviços de Adminis-
tração da Direcção Geral das
Construções Escolares
Lisboa

2347

7/6/83

Ofício 4657

-3. 490. 1983

" Emolumentos devidos ao Tribunal de Contas ".

Junto se remete, em satisfação do solicitado no ofi-
cio em referência, duas cópias da Guia nº 179/81 de Esc.: 956\$00,
oportunamente pagas.

Com os melhores cumprimentos.

o ENGENHEIRO DIRECTOR,

(Júlio Amaral de Carvalho)



GL/MM



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

À Firma:

David Pereira Nunes & Filhos, Lda
Rua do Araújo, 1299
Leça do Balio
4465 S. MAMEDE DE INFESTA

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência
Ofício n.º

Rua Júlio Dinis, 826, 4.º - Telef. 691815/691838
4000 - PORTO - Portugal

ASSUNTO: "Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade"
-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)-

4020

29 JUN 198

U. PORTO 2 arquivo central

Junto remeto a V. Sãs um exemplar do contrato da empreitada em epígrafe, devendo acusar a sua recepção. Remeto também 5 exemplares da guia nº 179/81 de esc: 956\$00, para pagamento dos emolumentos devidos pelo visto do Tribunal de Contas, devendo ser devolvidos a esta Direcção 3 exemplares depois de satisfeita a sua liquidação.

Com os melhores cumprimentos.

Ó Engenheiro-Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

MN.

tram
entregues
3 quibretes iguais



MINISTÉRIO DA Habitação e Obras Públicas

- (a) Direcção-Geral das Construções Escolares
- (b) Repartição dos Serviços Administrativos

Ano económico de 1961

Guia n.º 179/61

Cofre

Esc. 995800

Receita do Estado

Vai David Ferreira Neves & Filhos, Lda, com sede na Av. Rodrigues Vieira, 7. Loja do Balio

entregar (c) { no cofre do Tesouro em
na Tesouraria da Fazenda Pública

e em conformidade com o artigo 4.º do Decreto com força de lei n.º 13872, de 1 de Julho de 1927, e artigo 2.º do Decreto com força de lei n.º 14908, de 18 de Janeiro de 1928, a quantia de **noventa e cinquenta e seis escudos**

proveniente (d) dos emolumentos devidos nos termos dos Decretos-Lei 657/76 e 206/77 para a execução da "Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade - Aconselhamento da Alta Pórtua" (Faculdade de Ciências) V.T.C. 22/9/61 Proc.º 46150 1.ª Contabilidade-Geral que deverá ser escriturada como segue:

Capítulo	Grupo	Artigo	Descrição orçamental	Importância
15	02		Impostos Indirectos	
		03	Outros	
	03	23	Emolumentos do Y. Contas	470000
			Contas de Contas	
		04	Tribunaes Contas	478000

Lisboa, em 27 de Junho de 1961

Referência do processo
N.º _____
L.º _____
Dia _____

Assinado

[Signature]
Director dos Serviços
C. das Obras Públicas

(a) Serviço central do qual dependa o processador.
(b) Serviço processador.
(c) Riscar o que não convier. — Em Lisboa, Porto ou sede do distrito, as entregas serão feitas na tesouraria da Fazenda Pública.
(d) Indicar também o período a que a cobrança diz respeito.

568

A. J. B.

Exm^o. Senhor
 Chefe da Repartição Administrativa Ocidental
 da Câmara Municipal do Porto
 Rua de Cedofeita, 439-1^o
 4000 PORTO

26. JUL 1969

OFICIO 443

"Abertura de inquérito"

Nos termos do artigo 107 do Dec. Lei n.º 48.871 de 19 de Fevereiro de 1969 solicito a V. Exa. se digne mandar promover a abertura do inquérito administrativo respeitante à empreitada de "Universidade do Porto- Obras de Serviço de Contabilidade-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)" adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda, com sede na Rua do Arcaíjo, 1299 Leça do Balio - S. Mamede de Infesta, pela quantia de esc:- 478 000\$00.

Com os melhores cumprimentos.

Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)



DP.



S. R.
MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

Rua Júlio Dinis, 826-4.º — PORTO

Telefones { 691815
 { 691838

À Firma:

David Pereira Nunes & Filhos, Lda
Rua do Araújo, 1299
Leça do Balio
4465 S. MAMEDE DE INFESTA

Ofício N.º 5751^{PORTO}, 20. SET. 1991

Assunto: Autorização de pagamento n.º 12259, relativa à importância de Esc. 73 710 \$00, correspondente ao auto de medição de trabalhos n.º 2a que se junta referente à empreitada de « Universidade do Porto. Obras no serviço de contabilidade. Aproveitamento da Ala Poente.

O pagamento efectua-se na Secção de Finanças, junto do Banco de Portugal, nesta cidade.

Sirva-se V. S.ª acusar a recepção deste auto.

ENGENHEIRO DIRECTOR

Júlio Amaral de Carvalho

MN.

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

Empreitada Universidade do Porto
para o serviço de contabilidade
aproveitamento de 1/2 docente

O INTERVENIENTE ASSINA DE QUE TEM A SUA ASSINATURA REGISTADA PERANTE A PREVIDÊNCIA.

Assinatura

2ª Situação

Aos vinte dias do mês de Julho mil novecentos oitenta e um compareceram no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda

por contrato n.º 568/80 / D. G. C. E. Registo n.º 569/81 / 8.ª Rep. de 7 de Maio de 1981 na importância de Esc. 478 000\$00 visado pelo Tribunal de Contas em 22/5/81 o Eng.º Civil - Fernando de Pinto Matos e o adjudicatário representância

a fim de, em harmonia com as condições do programa do concurso e condições gerais do respectivo caderno de encargos, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado que se encontram executadas as quantidades de trabalhos que constam nas folhas de medição de trabalhos anexas rubricadas pelos intervenientes:

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO (RESUMO)	Importâncias totais
	Valor dos trabalhos realizados	78 000\$00

DESCONTOS:

0 % para garantia 3 900\$00
0,5 % para C. G. de Aposentações 390\$00

Importância líquida a receber 4290\$00
 importa na quantia de setenta e oito mil escudos

E nada mais havendo a tratar se lavrou o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelo funcionário que nele tomou parte e pelo adjudicatário.

O representante da Direcção-Geral Fernando de Pinto Matos
 O adjudicatário David Pereira Nunes

Visto
 Em 12 de Julho de 19 81
 O Director

Mod. 1-8.000 ex.-477

U. PORTO

ac arquivo
central

INFORMAÇÃO

436 CEN

f. Bruno

- 2. 100. 1981

"Universidade do Porto - Obras no Serviço de
Contabilidade - Aproveitamento da Ala Poente"
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A empreitada em epígrafe foi adjudicada por despacho do Exm^o Eng^o Subdirector-Geral de 27.10.80, ao abrigo do Dec.Lei n^o 447/75 de 20 de Agosto.

Os trâmites burocráticos inerentes à elaboração do contrato impediram que o visto do Tribunal de Contas surgisse a tempo de a totalidade do cabimento ser processada dentro do prazo contratual.

Nestas circunstâncias, solicita-se de V.Ex^a se digne obter despacho de autorização para a prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe, somente para efeitos administrativos, até ao dia 20 do corrente mês.

o ENGENHEIRO-DIRECTOR

(Júlio Amaral de Carvalho)

Exm^o Senhor

Director Geral das Construções Escolares

L ISBOA

U. PORTO

ac arquivo
central

Pr. 1/2
87

À Firma:

David Pereira Nunes & Filhos, Lda
Rua do Araújo, 1299
Leça do Balio
4465 S. MAMEDE DE INFESTA

OFICIO 4020

22 JUN 1981

"Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade"
-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)-

UNIVERSIDADE DO PORTO 2 arquivo central
Junto remeto a V. Sas um exemplar do contrato da empreitada em epígrafe, devendo acusar a sua recepção.

Remeto também 5 exemplares da guia nº 179/81 de esc: 956\$00, para pagamento dos emolumentos devidos pelo visto do Tribunal de Contas, devendo ser devolvidos a esta Direcção 3 exemplares depois de satisfeita a sua liquidação.

Com os melhores cumprimentos.

o Engenheiro-Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)



MN.



MINISTÉRIO DA Instrução e Obras Públicas

(a) Direcção-Geral das Construções Escolares

(b) Repartição dos Serviços Administrativos

Ano económico de 1901

Guia n.º 179/01

Cofre

Esc. 95000

Receita do Estado

Vai David Pereira Nunes & Filhos, Lda, com sede na Av. Rodrigues Veiros, 7 Loja do Gallo

entregar (c) $\left\{ \begin{array}{l} \text{no cofre do Tesouro em} \\ \text{na Tesouraria da Fazenda Pública} \end{array} \right.$

e em conformidade com o artigo 4.º do Decreto com força de lei n.º 13872, de 1 de Julho de 1927, e artigo 2.º do Decreto com força de lei n.º 14908, de 18 de Janeiro de 1928, a quantia de **noventa e cinco e seis cecudo**

proveniente (d) **de emolumentos devidos nos termos dos Decretos-Lei 667/76 e 296/77 para a execução da "Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade - Aproveitamento da Ala Poente" (Faculdade de Ciências) V.T.C. 22/5/01 Proc.º 40150 2.ª Contadoria-Geral que devesa ser escriturada como segue:**

Capitulo	Grupo	Artigo	Descrição orçamental	Importância
02			Impostos Indirectos	
	03		Outros	
		23	Emolumentos do T. Contas	479300
15			Contas de Ordens	
	03		Finanças e do Plano	
		04	Tribunal Contas	470000

Lisboa, em 17 de Junho de 1901

568

Referência do processo	N.º _____
	L.º _____
	Div. _____

Lançada
____/____/19____

Director dos Serviços,

Carlos Vieira Costa

Fl. 1/2
81

À Firma:

David Pereira Nunes & Filhos, Lda
Rua do Araújo, 1299
Leça do Balio
4465 S. MAMEDE DE INFESTA

OFICIO

4020

22 JUN 1981

"Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade"
-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)-

Junto remeto a V. Sãs um exemplar do contrato da empreitada em epígrafe, devendo acusar a sua recepção.

Remeto também 5 exemplares da guia nº 179/81 de esc: 956\$00, para pagamento dos emolumentos devidos pelo visto do Tribunal de Contas, devendo ser devolvidos a esta Direcção 3 exemplares depois de satisfeita a sua liquidação.

Com os melhores cumprimentos.

Ó Engenheiro-Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)



MN.

R



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

28/6/81
A. Henriques
R. Porto


Exmo. Senhor
Director das Construções Escolares
do

NORTE

Sua referência: Sua comunicação de Nossa referência: 3495 Praça de Alameda, 12 - Telef. 80 45 91/5
N.º /Contr. 1799 - Lisboa - Codex - Portugal
P.º

ASSUNTO: "Contratos"

"Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade
Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"



Junto envio a V. Ex.ª, 2 exemplares do contrato n.º 569/81
referente à empreitada em epígrafe.

Um dos exemplares destina-se ao empreiteiro.

Mais envio a Guia de Receita do Estado, em quintuplicado, para pagamento dos emolumentos devidos pelo "Visto" do Tribunal de Contas, pelo que V. Ex.ª. deverá remeter a este Departamento, no prazo máximo de 20 dias, os exemplares comprovativos do pagamento da mesma, para posterior remessa ao Tribunal de Contas.

Com os melhores cumprimentos.

~~SECRETARIA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO~~
PA O Director dos Serviços de Administração

Anexo: - 2 ex. do contrato
- Guia de R.E. 179/81
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
N.º 140 Proc. 90

Carlos Vieira Costa

L.G.

Carlos Vieira Costa

S.  R.

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

TERMO DO CONTRATO N.º 568 / 80

Data 7 / 5 / 81

Visado pelo Tribunal de Contas
em 22 / 5 / 81

Importância 478 000 \$ 00

Registado na 8.ª Repartição sob
o n.º 569 / 81

Designação:- "Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade -
- Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"

Adjudicatário David Pereira Nunes & Filhos, Ld.ª.

Processo n.º _____

celly
Ministério das Obras Públicas

Direcção-Geral das Construções Escolares

Orde
de
1980

Contrato número 568/80 para a execução da empreitada de "Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade - Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"

adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda.

pela quantia de 478 000\$00

U. PORTO

arquivo central

Aos sete dias do mês de Maio de mil novecentos e oitenta e um, nesta cidade de Lisboa, na sede da Direcção-Geral das Construções Escolares, compareceram perante mim, Maria Luísa Rainha das Neves Santos, casada, Chefe de Secção,

na qualidade de oficial público, designado nos termos do ~~artigo 13º do Decreto-Lei nº.211/79 de 12 de Julho~~ ^{número um do Artigo 13º. do Decreto-Lei nº.211/79 de 12 de Julho} ~~em representação e em nome do primeiro outorgante e em representação do Estado, o~~ ^{em representação e em nome do primeiro outorgante e em representação do Estado, o} ~~Subdirector-Geral, Engenheiro Rogério Leão de Almeida,-~~ ^{Subdirector-Geral, Engenheiro Rogério Leão de Almeida,-}

/ipa.

que para o efeito foi designado ao abrigo do disposto no parágrafo ~~segundo do artigo décimo quarto~~ ^{do Artigo décimo quarto} ~~do mencionado diploma~~ no despacho de vinte e sete de Outubro de mil novecentos e oitenta que aprovou a correspondente minuta, é como sêgundo outorgante, David Pereira Nunes & Filhos, Ld^ª., com sede na Av. Rodrigues Vieira, 7, Leça do Balio e que neste acto se fez representar por Jorge Eduardo Oliveira Pereira, casado e Renado Augusto Freitas de Moraes, casado.

U. PORTO



arquivo
central

para execução dos trabalhos atrás referidos e após concurso limitado realizado no dia vinte e seis de Setembro de mil novecentos e oitenta e de harmonia com o despacho de vinte e sete de Outubro de mil novecentos e oitenta do Senhor Subdirector-Geral.-

O presente contrato compreende as condições seguintes:

ARTIGO PRIMEIRO: — Na execução dos trabalhos que constituem o objecto deste contrato e em todos os actos que lhe digam respeito o adjudicatário obriga-se a cumprir o disposto no respectivo caderno de encargos, que fica fazendo parte integrante deste contrato.

ARTIGO SEGUNDO: — Os trabalhos constantes do presente contrato deverão iniciar-se dentro de oito dias, contados a partir da data da consignação e estar concluídos até ao fim do corrente ano, contados a partir da mesma data.-

Foi pago o imposto de selo
por meio de guia ao abrigo do
despacho do S. Estado do Orça-
mento de 9-9-980.

Clay

Junho

22

de

1980

A consignação terá lugar no prazo de 50 dias, contados da data de assinatura deste contrato,
produzido antes de pôr o Visto do Tribunal de Contas.

O prazo de garantia é de 365 dias

contados a partir da data da recepção provisória.

ARTIGO TERCEIRO:— Em toda a execução da obra vigorarão os salários mínimos, cons-
tantes da tabela oficialmente em vigor.—

ARTIGO QUARTO:— O encargo total deste contrato é de 478 000\$00, o qual será
custeado na sua totalidade pela dotação inscrita no Cap.5oº., Divisão 02, Sec-
tor 02, Código Económico 71.09, do orçamento em vigor para o corrente ano de
1980.—

ARTIGO QUINTO:— A empreitada será executada por preço global, fazendo-
-se o pagamento em prestações variáveis em função das quantidades de trabalho
periódico executadas.—

Pelo adjudicatário foi declarado que aceita o presente contrato com todas as suas condições.

de que tem inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obriga por sua pessoa e bens presentes e futuros, perante o Juízo da Comarca de Lisboa, com renúncia de quaisquer direitos em contrário

Neste acto foi verificado que o adjudicatário constituiu depósito definitivo na quantia de 23 900\$00, correspondente a 5% do valor da adjudicação, efectuado por garantia bancária na importância acima citada, prestada pelo Banco Borges & Irmão, Empresa Pública, com sede no Porto, a qual serve para garantir o integral cumprimento deste contrato.-

U. PORTO

arquivo
central

O adjudicatário apresentou documento comprovativo de ter efectuado no concelho de Matosinhos em 25.3.81, o pagamento da quantia de 62 195\$00, 1ª. Prestação, Grupo B, relativo à Contribuição Industrial, liquidação provisória, referente ao ano de 1980, conforme consta do Conhecimento nº.325.-

O presente termo do contrato está escrito em três meias folhas de papel de vinte e cinco linhas, seladas cada uma com uma estampilha fiscal de ~~quatro~~³⁰ escudos, que pelos outorgantes vão rubricadas à excepção da última por conter as assinaturas.

Foi pago o selo devido na importância de 1 434\$00, conforme guia Receita do Esta-

Foi pago o imposto de selo por meio de guia ao abrigo do despacho do S. Estado do Orçamento de 9-9-80.

do nº.284/80 de 4.11.80, efectuado na Tesouraria da Fazenda Pública de Matosinhos em 25.3.81, e guia R.E. nº.101/81 de 10.4.81, pelo papel selado.

São ainda devidos emolumentos pelo «Visto» do Tribunal de Contas, que serão satisfeitos nos termos ~~do Art. 2.º do Regulamento Financeiro nº.558/75 de 11.1.75~~ dos Decretos-Lei nºs.667/76 e 296/77.-

Ao presente contrato aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº.447/75 de 20.8, dentro da vigência que lhe confere o Decreto-Lei nº.519-R1/79 de 29.12, -digo:- Decreto-Lei nº.584/80 de 31.12.- - - - -

Foram de tudo testemunhas presentes, Ilda Miranda Pereira Pinto Ângelo, casada, segundo oficial e Idalina dos Anjos Ribeiro de Sá, viúva, escriturário-dactilógrafo de 1.ª. classe, ambos funcionários desta Direcção-Geral, os quais com as partes outorgantes vão assinar o presente contrato celebrado perante mim, que o fiz escrever e também assino, depois de o todos ter sido lido em voz alta.- - -

David Henriques
Ilda Miranda Pereira Pinto Ângelo
Idalina dos Anjos Ribeiro de Sá

Em tempo se declara que não tendo sido possível ultimar as formalidades inerentes à celebração do presente contrato, passará o seu Art.º.4º. a ter a seguinte redacção:- - - - -

-O encargo total deste contrato é de 478 000\$00, dos quais foram despendidos 400 000\$00 pela dotação inscrita no Cap.5º., Sector 02, Divisão 02, Código Económico 71.09, do orçamento em vigor em 1980 e os restantes 78 000\$00 ou o que se apurar como saldo pela rubrica que lhe corresponder no orçamento para 1981.-

TRIBUNAL DE CONTAS
 Direcção - Geral
 48130 20. MAI 81
 1ª REPARTIÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS
 VISTO
 22 MAI 81

Jair Lima

Mais se declara que, não impedimento legal do primeiro outorgante, assina o presente contrato, o Director-Geral, Engenheiro Artur Eduardo de Macedo Gonçalves, casado, também funcionário desta Direcção-Geral.

Jair Lima

U. PORTO @ arquivo central

[Circular stamp and signature]

SP 13 1121 01	3050/1
RI 471 001 01 11	
Admissão de que trata o presente documento tem cabimento na Cap. 52, Art.º 22, N.º 2, Al.º 1, 2º da Orçamento em vigor, por Ess. 48 000 \$ 00	
15/1/1981	Confirma, <i>[Signature]</i>

SERVIÇO DO VISTO
 EM CIMA SITUAÇÃO
 1/2 - 57 da Tabela anexa ao Dec. Lei 25.020, de 20.11.64, art. 1.º do Dec. Lei 607 76; o Dec. Lei 290/77.
 — PARA O ESTADO 472400
 — PARA O COFRE DO T.C. 478400
TOTAL 956400

Exm^o. Senhor
Chefe da Repartição dos Serviços Administra-
tivos da Direcção-Geral das Construções
Escolares
LISBOA

2384


20.4.81

OFICIO

2891

6 MAI 1981

"Universidade do Porto -Obras no Serviço de Contabilidade-
aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"

U. PORTO  arquivo

Junto se envia a V.Exa. o exemplar do contrato da empreitada em epígrafe, devidamente assinado pelo adjudicatário - David Pereira Nunes & Filhos, Lda.

Remeteremos também a guia de Receita do Estado n.º 101781 da importância de esc:- 360\$00, comprovativa do pagamento do imposto de selo devido pelo visto do Tribunal de Contas.

Com os melhores cumprimentos.

o Engenheiro Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

DP.

Jian



MINISTERIO DA SAUDE E OBRAS PUBLICAS

Departação dos Servicos Administrativos

Direcção-Geral das Condições de Trabalho

Ano económico de 1953

Classe 1.1.1.1

Cofre

Esc. 1.1.1.1

Recetta do Estado

Via: Maria Pereira Augusto, Filhos, Lda., com sede na Av. Rodrigues Vieira, 7, Aradjo, Lagoa de Lagos.

entregar-se-á no cofre do Tesouro em
na Tesouraria da Fazenda Publica

em conformidade com o artigo 4.º do Decreto com força de lei n.º 18812, de 1 de Junho de 1952, e artigo 2.º do Decreto com força de lei n.º 14908, de 18 de Janeiro de 1953 a qual se refere a...

U. PORTO 3
que deverá ser escriturada como segue:

Capitulo	Grupo	Artigo	Descrição orçamental	Importancia
02			<u>Impostos Municipaes</u>	
			Imposto Municipal	200 00

em ... de ...

Assinado

R.B.



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
 REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Secção de Contratos

22/4/81
A. Leunbauer

Exm^o. Senhor

Director das Construções
 Escolares do Norte
 Rua Júlio Dinis, 826, 4^o.
 4000 PORTO

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Praca de Alvalade, 12 - 1799 Lisboa - Codex

CONTRATAÇÃO

N.º 2384

Telef. 80 45 91/5

20.ABR.1981

ASSUNTO:


"Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade - Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"

Junto envio a V.Ex^o a fim de ser ser ~~assinado~~ assinado pelo empreiteiro, um exemplar do contrato relativo à empreitada em epígrafe, o qual deverá ser devolvido a esta Repartição no prazo máximo de 5 dias, a contar desta data, acompanhado do ^{duplicado} ~~original~~ da guia Receita do Estado n.º.101/81, comprovativa da efectivação do seu pagamento.

Com os melhores cumprimentos.

~~DO CHEFE DE SECÇÃO~~

P.V. O DIRECTOR DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO



Carlos Vieira Costa

Anexo: 1 contrato

1 processo

Guia R.E.n.º.101/81

/ipa.

João Henrique B... Costa

RR



H. 20/4/81

1/4/81
A. de Sousa
[Signature]

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Cabrita
2/5/81

Exmº Senhor

Director dos Serviços Regionais
de Construções Escolares do Norte
Rua Júlio Dinis, 826 - 4º
4 000 P O R T O

Sua referência:

Sua comunicação de

Nossa referência

Fraça de Alameda, 12 - Telej. 80 45 91/3

N.º 2094

1799 - Lisboa - Codex - Portugal

30 MAR 1981

ASSUNTO:

"Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências) da Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade


Dado o adjudicatário da empreitada em epígrafe, David Pereira Nunes & Filhos, Ldª., não ter, até à data, enviado os elementos relativos à elaboração do contrato, pedidos pelo n/office nº 6 342 de 6/11/80, solicito de V.Exª se digne mandar suspender os pagamentos da empreitada até à efectivação do contrato.

Com os melhores cumprimentos.

O DIRECTOR DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

[Signature]

Carlos Vieira Costa



/IS

Exmo. Senhor
Chefe da Repartição dos Serviços
Administrativos da Direcção-Geral
das Construções Escolares

L I S B O A

6 342

6/11/81

OFICIO

2200

-2. 18. 1931

"Universidade do Porto- Obras no Serviço de Contabilidade-
- Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"

U. PORTO 2 arquivo central
Junto se envia a V. Exa. os elementos abaixo designados,
destinados à elaboração do contrato da empreitada em epigrafe, adjudi-
cada à firma David Pereira Nunes & Filhos, Lda.:

- garantia bancária de esc: 23 900\$00, passada pelo Ban-
co Borges & Irmão, para substituição do depósito definitivo;
- guia receita do Estado da importância de esc: 1 434\$00,
respeitante ao pagamento do imposto do selo;
- declaração da tabela de salários mínimos em vigor.

Só agora o adjudicatário apresentou os documentos a pesar
de várias insistências nesse sentido.

Com os melhores cumprimentos

Engenheiro Director

Júlio Amaral de Carvalho



Nos termos da Lei não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens.



DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Garantia n.º 38.192

Em nome e a pedido de DAVID PEREIRA NUNES & FILHOS, LDA., empreiteiros de obras públicas, com sede na Av. Rodrigues Vieira, 7-Araújo-Leça do Balio, adjudicatários da empreitada de "Obras na Universidade do Porto-Serviço de Contabilidade-Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)-----

-----" vimos declarar em nome do BANCO BORGES & GUERÃO, Empresa Pública, com sede no Porto, à Rua de Sá da Bandeira n.º 20, e nos termos e para efeitos do Decreto

Real n.º 48871 de 19/2/69, que ser como todas as garantias bancárias até ao montante de Esc. 23.900\$00 (virte três mil novecentos escudos-----

-----) inerentes ao depósito definitivo correspondente a 3% do valor de adjudicação da referida empreitada, como se estivesse cons-


tituído em nome corrente, responsabilizando-nos dentro destas garantias e para todos os efeitos legais ou contratuais, por fornecer a entrega de qualq-

quer importâncias que se tornem necessárias até à saida limite, logo que a Direcção Geral das Construções Escolares o exigir, e os empreiteiros, por

falha de cumprimento de seu contrato ou de qualq. compromissos assumi-

dos em consequência do mesmo, com a não entrega do referido valor, até ao valor da presente garantia (total de Esc. 23.900\$00 (virte três mil novecentos escudos).

Porto, 1 de Maio de 1969



Reconheço as duas assinaturas KLW
de Lima Neto
e de Antônio S.P.
certifico que os signatários são procuradores
em exercício do Banco Borges e Irmão com
poderes por este, conforme verifiquei por docu-
mentos arquivados neste Cartório

Porto a 1^o Cartório Notarial, 1 de
de 1991

36/W Cont'a N.º 325 O Ajudante

U. PORTO



arquivo
central



MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

(a) Direcção-Geral das Construções Escolares

(b) Repartição dos Serviços Administrativos

Ano económico de 1980

Guia n.º 534/30

Cofre

Esc. 1 454,00

Receita do Estado

Vai David Pereira Mendes e Filhos, Lda., com sede na Av. Rodrigues Vieira, 7, no Aradjo, Legação de Lisboa

entregar (c) $\left\{ \begin{array}{l} \text{no cofre do Tesouro em} \\ \text{na Tesouraria da Fazenda Pública} \end{array} \right.$

e em conformidade com o artigo 4.º do Decreto com força de lei n.º 13872, de 1 de Julho de 1927, e artigo 2.º do Decreto com força de lei n.º 14908, de 18 de Janeiro de 1928, a quantia de mil quatrocentos e trinta e quatro escudos - - - - -

proveniente (d) do imposto do selo devido nos termos do Art. 1.º do Dec. n.º 13872, de 1 de Julho de 1927, em execução do cap.º "Univ. Porto-Ultra Serviço Contabilidade-Aprov. A" a que deverá ser escriturada como segue:

Capítulo	Grupo	Artigo	Descrição orçamental	Importância
02			<u>Impostos Indirectos</u>	
	03		Outros	
		00	Imposto do selo	1 454,00

prof. José Matos
para o cofre

Lisboa, em 4 de Novembro de 1980

DO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO-GERAL
O CHefe de Secção

Referência do processo	N.º _____
	L. _____
	D. _____

Assinatura	_____ / 19__
------------	--------------

[Handwritten signature]
(Maria Luísa Martins)

(a) Serviço central do que depende o proponente.
(b) Em Lisboa, Porto ou sedes de distritos, as entregas serão feitas no Banco de Portugal, respectivamente na sede, filial ou agência; nas sedes dos concelhos, far-se-ão nas tesourarias da Fazenda Pública.
(c) Indicar também o período a que a cobrança diz respeito.



P/CONNECT. A CEN

S/11 Jeca

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES Muito Urgente
 DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
 REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Secção de Contratos

7/11/80

Alcântara

A Firma

David Pereira Nunes & Filhos, Lda.
 Av.: Rodrigues Vieira, 7

C/Aviso Recuperação

ARAÚJO

LEGA DO BALIO

See referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Praca de Alameda, 12-1799 Lisboa-Códes

N.º 6342

Telef 00 45 91 15

-6.NOV.1980

ASSUNTO:

**"Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade -
 - Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)"**

A fim de ser elaborado o contrato da empreitada em epígrafe
 adjudicada a **Vs. Ex.ªs.** por despacho de **27.10.80**
 no valor de Esc: - **478 000 000**, torna-se necessário o envio a esta
 Repartição, dos elementos abaixo designados, no prazo máximo de 8 dias:

- Guia (duplicado) comprovativa do depósito definitivo de 5%
 de Esc: **23 900 000** para garantia do contrato (esta guia
 é passada mediante modelo que se junta) ou garantia bancária
 de igual valor. - - - - -
- Guia de Receita do Estado para efeito do pagamento do imposto
 do selo de Esc: **1 434 000** devido pelo contrato a celebrar,
 Logo que a guia se encontre liquidada deverá o respectivo du-
 plicado ser devolvido a esta Repartição. - - - - -
- Declaração de que se sujeita à tabela dos salários mínimo em
 vigor. - - - - -
- Declaração com assinatura reconhecida donde conste que não es-
 tá em dívida à Fazenda Nacional por contribuições e impostos
 liquidados nos últimos 3 anos. - - - - -
- Documento comprovativo do pagamento da Contribuição Industrial
 respeitante ao ano findo. - - - - -
- Nome, estado e residência da pessoa que representa a firma na
 assinatura do contrato, bem como o número do B.I. data, prazo
 de validade e Arquivo de Identificação que o forneceu. - - - -
- Número, classe e categoria de Alvará do empreiteiro. - - - - -


Nota: O presente contrato

foi elaborado de acôr
 do c/Dec.447/75.

Com os melhores cumprimentos

POR DELEGAÇÃO DO DIRECTOR-GERAL
 O Chefe de Secção dos Contratos

Cópia à CEN



(Maria Luísa Rainha)

Anexo: modelo de Guia
 /ipa.

ACCEN
para submissão

11/4/81

[Handwritten signature]

A firma

David Pereira Nunes & Filhos, Lda
Av. Rodrigues Vieira, nº 7
Araújo Leça de Bailio
4 465 São Mamede de Infesta

C/aviso de recepção

2089

30.MAR.1981

"Aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências) da Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade


Pelo n.º/ofício nº 6 342 de 6/11/80, foi solicitada a V.Ex.ª o envio dos elementos necessários para a elaboração do contrato da empreitada supra.

Não tendo sido recebidos, dentro do prazo legal, os respectivos documentos, mais uma vez se recorda a V.Ex.ª que, o não cumprimento do solicitado obrigará esta Direcção-Geral a proceder de acordo com o estipulado no Art.º 96.º do Decreto-Lei nº 48 871 de 19/2/69 (se o adjudicatário não prestar em tempo a caução definitiva e não houver sido impedido de o fazer por facto independente da sua vontade que seja reputada justificação bastante, perderá o montante da caução provisória a favor do dono da obra e a adjudicação considerará-se-á desde logo sem efeito).

Os citados elementos deverão ser entregues, ispreterívelmente, nesta Repartição até 6 /4/81.

Com os melhores cumprimentos.

O DIRECTOR DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO



568
Anexo: Cópia à GEN

LR/IS

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

Consignação 27.10.80
Prazo 31.12.80
Escalonamento .. 478 000\$00

BP13120100

R65002027109

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS

Empreitada Universidade do Porto -
- Reitoria da Universidade - Servi
ço de Contabilidade

1.ª Situação

Aos três dias do mês de Dezembro mil novecentos oitenta

compareceram no local onde estão sendo executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda

por contrato n.º / D. G. C. E. Registo n.º / 8.ª Deleg. de de 197.....

na importância de Esc. 478 000\$00 visado pelo Tribunal de Contas em

o Eng.º Civil - Fernando de Pinho Noites
representante

e o adjudicatário

a fim de, em harmonia com as condições do programa do concurso e condições gerais do respectivo caderno de encargos, procederem ao exame e medição dos trabalhos, tendo verificado que se encontram executadas as quantidades de trabalhos que constam nas folhas de medição de trabalhos anexas rubricadas pelos intervenientes;

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO (RESUMO)	Importâncias totais
	Pagamento nos termos do Dec. Lei nº 447/75 de 20/8 - vigência Dec. Lei nº 519-R1/79 de 29.12	arquivo central
	Valor dos trabalhos realizados	400 000\$00

DESCONTOS:

5 % para garantia 20 000\$00
0,5 % para C. G. de Apresentações 2 000\$00

22 000\$00

Importância líquida a receber 378 000\$00

Importa na quantia de Quatrocentos mil escudos - - - - -

MC/MJ

E nada mais havendo a tratar se lavrou o presente auto que depois de lido e julgado conforme, vai ser assinado pelo funcionário que nele tomou parte e pelo adjudicatário.

O representante da Direcção-Geral

Fernando de Pinho Noites

O adjudicatário David Pereira Nunes

Visto

Em 18.12.1980

Director

C E R T I D ã O

Certifico que **David Pereira Nunes & Filhos, Lda**,
interessado no ^{AUTO} _{RSA} junto de **3 / 12 / 80**, apresentou nestes Ser-
viços certidão comprovativa de que tem a sua situação regularizada
com a Previdência, nos termos do Decreto-Lei nº 25/77 de 19 de
Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº 146/79 de
23 de Maio.

/ DIRECTOR DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

(Júlio Augusto do Amaral Teixeira de Carvalho)

/AM



Pl. 24/11/80

VISTO
20/11/1980
DIRECTOR

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO - GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
Direcção das Construções Escolares do Norte



AUTO DE CONSIGNAÇÃO DE TRABALHOS nos termos do D.L. 447/75 de 20 de Agosto, dentro da vigência que lhe confere o Dec. Lei nº 519-R1/79, de 29.12.

No dia **quatro** de **Novembro** de mil novecentos e **oitenta**, no local onde devem ser executados os trabalhos que constituem* **Universidade do Porto - Obras no Serviços de Contabilidade - aproveitamento da Ala Poente (Faculdade de Ciências)** adjudicada a **David Pereira Nunes & Filhos, Lda** por despacho de **Subdirector-Geral** de **vinte sete** de **Outubro** de mil novecentos e **oitenta** compareceram **o Engenheiro-Civil, Fernando de Pinho Noites** e **o representante,**

adjudicatário dos referidos trabalhos. Foram entregues ao adjudicatário cópias das peças escritas e desenhadas a que se refere** **empreitada** e prestadas as necessárias e convenientes indicações para ficarem bem definidas as condições em que os trabalhos devem ser realizados.

Neste acto reconheceu-se que **tudo estava de harmonia com as cláusulas contratuais e segundo o projecto**

Por **representante,**

adjudicatário foi declarado que aceitava e reconhecia como inteiramente exactos os mencionados resultados dos quais se conclua: **tudo estar conforme**

Por **Engº Civil, Fernando de Pinho Noites**

como representante do dono da obra foi declarado que aceitava as conclusões e fazia a consignação dos respectivos trabalhos, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 447/75, de 20 de Agosto.

Neste acto foi apresentado pelo adjudicatário o certificado do seguro do pessoal, pela apólice n.º **56576** da Companhia de Seguros **"Portugal-Previdente"**

E não havendo mais nada a tratar, foi dada por finda a consignação e lavrado o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelos que intervieram neste acto.

Fernando de Pinho Noites
David Pereira Nunes

*a empreitada ou o fornecimento

**Departamento Regional

R. 3/11/80

À Firma

David Pereira Nunes & Filhos, Lda

Rua do Araújo, 1299

Leça do Balio

4465 S.MAMEDE DE INFESTA

Ofício n.º

PORTO — Rua Júlio Dinis, 826-4.º

6044

31. OUT. 1980

ASSUNTO:

"Universidade do Porto - Reitoria - Obras no Serviço de Contabilidade - aproveitamento da Ala Poente -"

Para conhecimento de V. Sa.(s) e devidos efeitos, comunico que por despacho ministerial de **27.10.80**, foi aprovada a sua proposta na importância de Esc. **478 000\$00**

para a execução das obras em epígrafe, as quais vão ser objecto de contrato escrito.

Juntam-se os orçamentos referentes às mesmas obras.

NOTA: Ficam V.Sas. avisados de que, em obediência ao que estipula a alínea b), do n.º 1.º do art.º 29 do Decreto-Lei n.º 447/75, de 20 de Agosto, os trabalhos deverão ter início no prazo máximo de 5 dias a partir desta data.

A BEM DA NAÇÃO
ENGENHEIRO-DIRECTOR,

~~(Rui Montenegro)~~ DP/

(Júlio Amaral de Carvalho)

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES

DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

447/75

AUTORIZO

Em 27.10.1980

O SUBDIRECTOR-GERAL

R. Leão de Almeida

R. Leão de Almeida

SECÇÃO DE PROCEDIMENTO GERAL - ARQUIVO
CLASSIFICADO <i>fm. J. n. 2</i>
A. G. N. 2 U. R. C.
28/10/80

30/10/80
Planificação
Sup. Norte
Adm. Juntas

fmi
11.11.80

- Restauraç^o Porto.

- 1. OUT. 1980

J. Leão de Almeida

PROPOSTA N.º **549** /CEN

ASSUNTO: "Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade - aproveitamento da Ala Poente" (FAULDADE DE QUINELA)

- Cap.º 50 Div. 02 C.E. . 02 . 71.09 - 478 000\$00

Por ser necessário e urgente realizar as obras em epígrafe, promoveu esta Direcção, nos termos da alínea a) do nº 1 do artº 5º do Dec. Lei nº 211/79, de 12 de Julho, a abertura de um concurso limitado, em 26 de Setembro findo, com o preço-base de esc: 473 090\$00 e prazo de execução até ao fim do corrente ano.

Foram convidadas:

- Joaquim Correia & Ca Lda
- David Pereira Nunes & Filhos, Lda
- António Almeida e Silva & Ca Lda
- Ferreira dos Santos & Rodrigues, Lda
- David de Oliveira, Lda

tendo sido apresentada a seguinte proposta:

Comunicação
28/10/80
Restauraç^o

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
DIRECÇÃO-GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE


Folha nº
R.º
N.º
Data,
Arquivo central

David Pereira Nunes & Filhos, Lda 478 000\$00

Afigura-se que esta proposta é vantajosa aos interesses do Estado porque obedece ao caderno de encargos, apresenta em relação ao preço-base um agravamento insignificante, a corrente compromete-se a concluir os trabalhos no prazo estipulado e tem demonstrado, noutras obras por si efectuadas, possuir qualidades que garantem a boa execução desta empreitada.

Tem-se, assim, a honra de sugerir a V.Exª que a empreitada seja adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda pela quantia de esc: 478 000\$00, mediante a celebração de contrato escrito, nos termos do diploma legal atrás citado e com a aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 447/75, de 20 de Agosto, dentro da vigência que lhe confere o Dec. Lei nº 519-R1/79, de 29 de Dezembro.


Mais sugiro a V.Exª a concessão da verba de esc: 478 000\$00, para satisfação do presente encargo, a qual tem cabimento nas disponibilidades da rubrica orçamental em referência.




O Engenheiro-Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

Exmo Senhor
Director-Geral das Construções Escolares
Lisboa



GL/MN



100202705

U. PORTO


SPB120147004 478 000 00 5380
00

arquivo central

178 000 00

2 10 80 6

x *afianç.* 2/ 30 80
pendiz

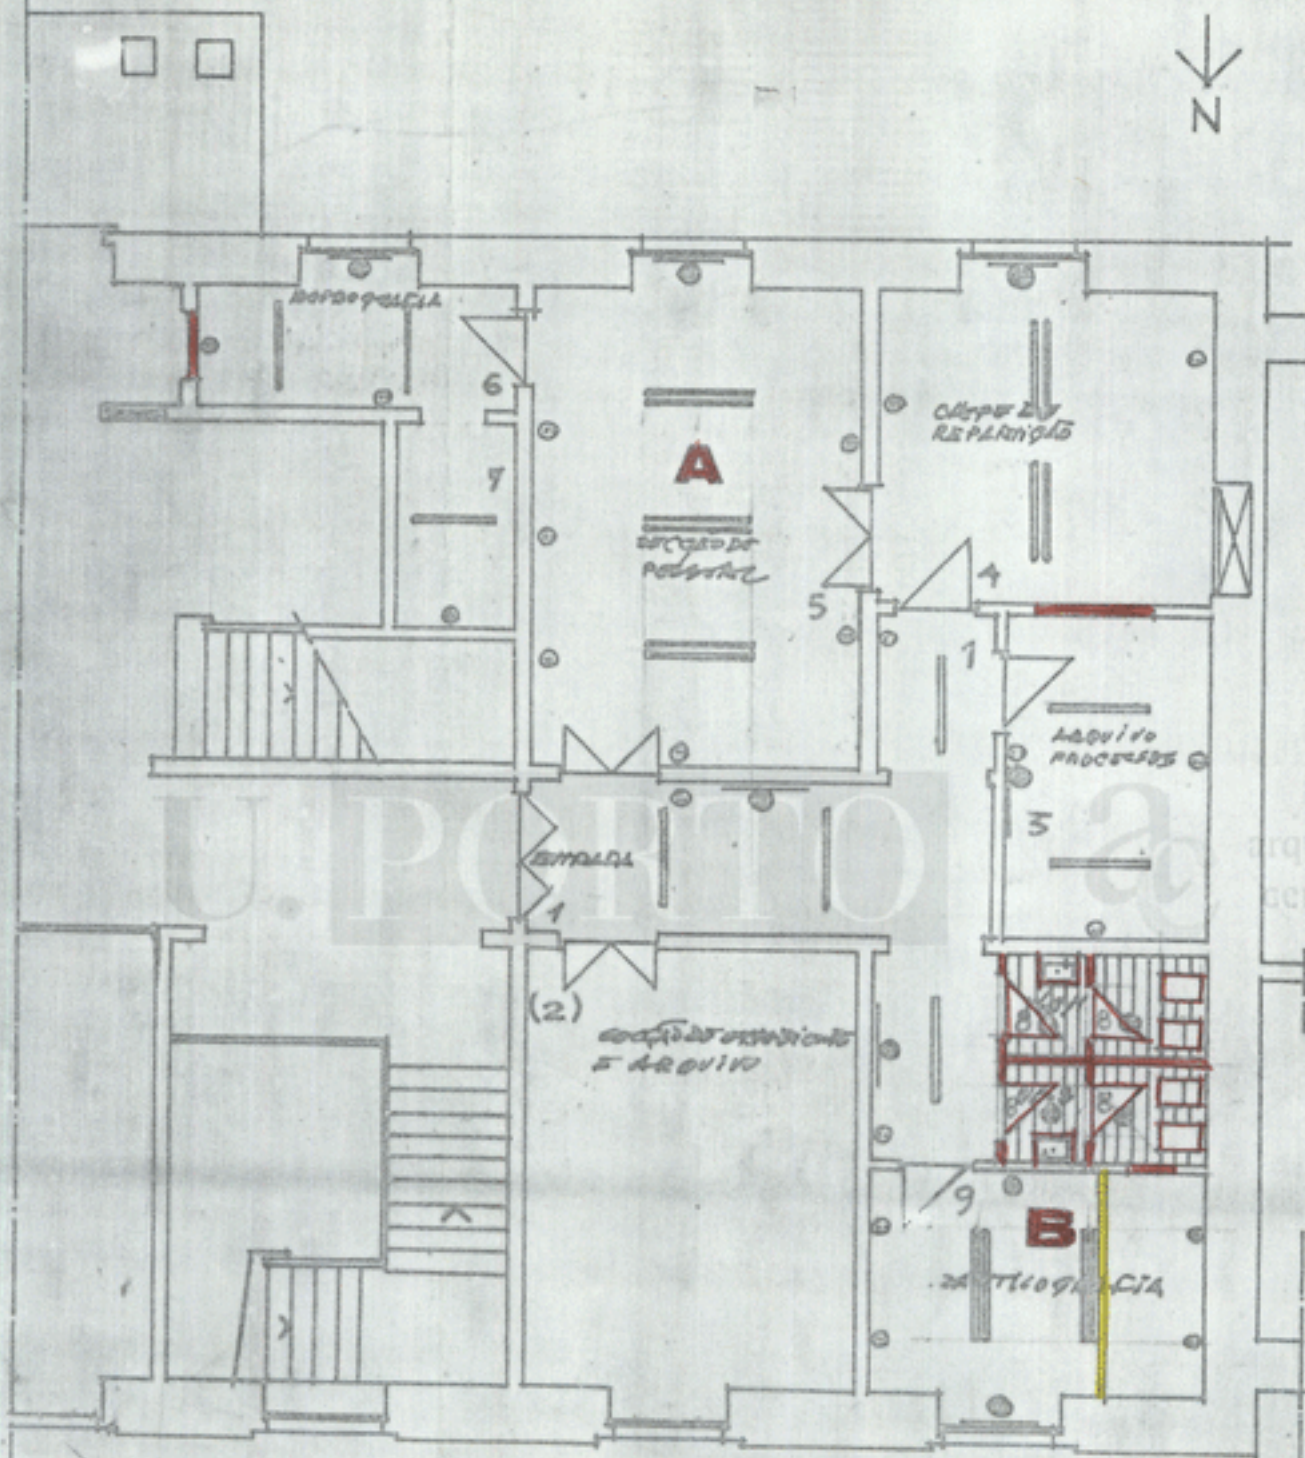

- ⊙ TOMADA - LUZ
- ⊙ " AQUECIMENTO
- L. FLUORESCENTES 40 W.
- IRRADIADOR 1500 W.
- ⊙ L. INCANDESCENTES
- A CONSTRUIR
- A DEMOUIR

N.D. - A SECCAO DE EXPEDIENTE
E ARQUIVO (2) NA PRECISA
DE OBRAS.

Pl. 3/10/80

11/10/80

U. PORTO
PROPOSTA

arquivo central

549

-1. OUT. 1980

"Universidade do Porto - Obras no Serviço de Contabilidade - aproveitamento da Ala Poente"

50 02 02 71.09 - 473 000\$00

Por ser necessário e urgente realizar as obras em epígrafe, promoveu esta Direcção, nos termos da alínea a) do nº 1 do artº 5º do Dec.Lei nº 211/79, de 12 de Julho, a abertura de um concurso limitado, em 26 de Setembro findo, com o preço-base de esc: 473 090\$00 e prazo de execução até ao fim do corrente ano.

Foram convidadas:

- Joaquim Correia & Cª Lda
- David Pereira Nunes & Filhos, Lda
- António Almeida e Silva & Cª Lda
- Ferreira dos Santos & Rodrigues, Lda
- David de Oliveira, Lda

tendo sido apresentada a seguinte proposta:

David Pereira Nunes & Filhos, Lda

478 000\$00

Afigura-se que esta proposta é vantajosa aos interesses do Estado porque obedece ao caderno de encargos, apresenta em relação ao preço-base um agravamento insignificante, a concorrente compromete-se a concluir os trabalhos no prazo estipulado e tem demonstrado, noutras obras por si efectuadas, possuir qualidades que garantem a boa execução desta empreitada.

Tem-se, assim, a honra de sugerir a V.Exa que a empreitada seja adjudicada a David Pereira Nunes & Filhos, Lda pela quantia de esc: 478 000\$00, mediante a celebração de contrato escrito, nos termos do diploma legal atrás citado e com a aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 447/75, de 20 de Agosto, dentro da vigência que lhe confere o Dec. Lei nº 519-RI/79, de 29 de Dezembro.

Mais sugiro a V.Exa a concessão da verba de esc: 478 000\$00, para satisfação do presente encargo, a qual tem cabimento nas disponibilidades da rubrica orçamental em referência.

U. PORTO

O Engenheiro-Director,

(Júlio Amaral de Carvalho)

arquivo
central

Exmo Senhor
Director-Geral das Construções Escolares
Lisboa

GL/MN

VDA20205

Descrição Financeira		N.º do cabimento
470008	47800000	
47800000		
2 10 80 6		
* <i>Oficina</i>		

Processo de Contabilidade

U. PORTO

arquivo central

David Pereira Nunes & Filhos, L.^{da}

— ENCARREGAM-SE DE TODO O SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO CIVIL —
ESPECIALIDADE — TROLHA, PINTOR E VIDRACEIRO

AV. RODRIGUES VIEIRA, 7 TELEF. 952508 ARAÚJO — LEÇA DO BALIO

26.9.80

Am
David Pereira Nunes



P-R-O-P-O-S-T-A

David Pereira Nunes & Filhos, Lda, com sede na avenida Rodrigues Vieira, 7 Leça do Balio, depois de ter tomado conhecimento do objecto de empreitada na Reitoria da Universidade do Porto-Obras Serviço de contabilidade e aproveitamento da ala poente, convite datado de 17 de Setembro de 1980 obriga-se a executar a referida empreitada de harmonia com o caderno de encargos, pelo preço global de esc: 478.000\$00 (QUATROCENTOS E SETNTA OITO MIL ESCUDOS) e até ao fim do corrente ano.

Mais declara que renuncia o foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu contrato ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Leça do Balio, 26 de Setembro 1980

David Pereira Nunes
LEÇA DO BALIO, ARAÚJO, 26.9.80

David Pereira Nunes & Filhos, L.da

MESTRE DE OBRAS

ESCRITÓRIO:

RUA DO ARAÚJO, 1299
Telef. 952508

LEÇA DO BALIO
4465 S. MAMEDE DE INFESTA

AV. RODRIGUES VIEIRA
Telef. 953092

26.9.8
RECEBIDA
[Signature]

ORÇAMENTO

1

DESIGNAÇÃO	Quantidades	Preços Unitários	IMPORTÂNCIAS	
			Por Obras	Por Capítulos
UNIVERSIDADE DO PORTO REITORIA				
<u>Serviço de Contabilidade e aproveitamento da Ala Poente.</u>				
Artº-1º Demolição de uma parede interior.	1 Uni		2.700\$00	
Artº 2º Picar, rachear, cerezitar e endireitar, estanhar uma parede que se encontra com salitra, parede exterior pela face interior.	28m2	640\$0	17.920\$00	
Artº 3º Picar o reboco existente rebocar para receber azulejo até altura de 2 metros nos banhos.	42 m2	400\$0	16.800\$00	
Artº 4º Azulejo branco 15x15 até altura de 2 metros nos banhos.	42 m2	458\$0	19.236\$00	
Artº 5º Divisórias em tijolo 0,07 nos sanitarios	27 m2	450\$0	12.150\$00	
Artº 6º Raspagem do pavimento para receber alcatifa	140 m2	80\$0	11.200\$00	
Artº 7º Picagem do azulejo na antiga cosinha e rebocar	30 m2	450\$0	13.500\$00	
			93.506\$00	

DESIGNAÇÃO	Quantidades	Preços Unitários	IMPORTÂNCIAS	
			Por Obras	Por Capítulos
DE TRANSPORTE			93.506\$00	106\$00
Artº 8º Tapagem de três portas a tijolo 0,07	8m2	450\$00	3.600\$00	
Artº 9º Reboco nas tres portas que se taparam com tijolo	16 m2	350\$0	5.600\$00	
Artº 10 Pintura a tinta plastica interior, lavar e tomar as paredes para depois se pintar.	412 m2	120\$0	49.440\$00	
Artº 11 Pintura de tectos a tinta plastica	140 m2	130\$0	18.200\$00	
Artº 12º Portas em placarol e pintura das mesmas pelas duas faces	4 Uni	7.200\$0	28.800\$00	
Artº 13º Mudança de todas as fechaduras e puxadores	7 Uni	1000\$00	7.000\$00	
Artº 14º Instalação para aquecimento, tomadas.	7 Uni	1.100\$0	7.700\$00	
Artº 15º Convectores iguais aos existentes de 1.500 W.	7 Uni	5000\$0	35.000\$00	
Artº 16º Tomadas e interruptores	26 Uni	1600\$0	41.600\$00	
Artº 17º Armaduras duplas com pendurais em latão cromado.	7 Uni	4500\$0	31.500\$00	
18º Armaduras simples	9 Uni	2500\$0	22.500\$00	
19º Armadura circulares de 40 W para os banhos.	4 Uni	2500\$0	10.000\$00	
a transportar			354.446\$00	

David Pereira Nunes & Filhos, Lda

MESTRE DE OBRAS

da 26.9.88
 MR
 RESIDÊNCIA
 AV. RODRIGUES VIEIRA, 7
 Telef. 953092

ESCRITÓRIO:

RUA DO ARAÚJO, 1299
 Telef. 952508

LEÇA DO BALIO
 4465 S. MAMEDE DE INFESTA

AV. RODRIGUES VIEIRA, 7
 Telef. 953092

ORÇAMENTO

3

DESIGNAÇÃO	Quantidades	Preços Unitários	IMPORTÂNCIAS	
			Por Obras	Por Capítulos
DE TRANSPORTE.....			354.446\$00	
Artº 19º - Instalação de água fria para os sanitários em tubo galvanizado.....	1 Uni		10.000\$00	
Artº 20º - Dois bidês, duas bacias de retrete, dois lava tórios.....	1 Uni		24.000\$00	
Artº 21º - Sifões e esgotos.....	1 Uni		19.954\$00	
Artº 23º - Canops.....	2 Uni	3.000\$00	6.000\$00	
Artº 24º - Tectos falsos Amstrong nos compartimentos A, B, com perfil à vista.....	43 m2	1.500\$00	64.500\$00	
TOTAL.....			478.000\$00	
(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL ESCUDOS)				



Universidade do Porto

Reitoria

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

RUA DE D.MANUEL II

OBRAS A REALIZAR NO 29.PAVIMENTO - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

PAREDES INTERIORES - As paredes, depois de lavadas e retocadas, receberão duas demãos de tinta plástica "NOVAQUA-CIN".

No entanto a parede, a sul, danificada por acção de infiltrações de água e, em parte, "salitrada" terá de ser picada, cespitada e rebocada para receber o estucado e pintura.

As paredes dos sanitários serão revestidas de azulejo branco 0,15x0,15 m até 2,00 m de altura, sendo a superfície sobranete, pintada.

As paredes a criar serão formadas com tijolo vasado de 0,07 m.

TECTOS - Serão pintados com tinta plástica do tipo já mencionado; no entanto, nos compartimentos A e B serão montados tectos falsos "AMSTRONG" com suspensão à vista e painéis muito claros; estes tectos ficarão a 2,80 m do pavimento.

PAVIMENTO - O pavimento geral será raspado de modo a permitir a colagem de alcatifa (esta fora da empreitada).

O pavimento dos sanitários será executado com mosaico cerâmico.

PORTAS - As portas dos sanitários serão do tipo "PLACAROL", pintadas a esmalte nas duas faces.

FERRAGENS - As fechaduras e puxadores das portas existentes serão substituídas por outros da marca e tipo dos existentes nesta Secção de Contabilidade.

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - Será feita uma revisão geral à instalação eléctrica deste Sector de modo ao seu perfeito funcionamento e segurança. Os interruptores, tomadas, armaduras, aquecedores, etc., serão da qualidade e marca dos já existentes. Todas as armaduras de iluminação ficarão a 2,80 m do pavimento utilizando-se, na generalidade, suspensões metálicas.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Será aplicada louça VALADARES branca, sendo as bacias de retrete equipadas com cisternas exteriores "DILÚVIO". As peças sanitárias serão alimentadas com água fria e as torneias, passadores, etc. serão iguais aos existentes na Secção.

Porto, 6.6.1980

UNIVERSIDADE DO PORTO - REITORIA

SERVIÇO DE CONTABILIDADE-APROVEITAMENTO DA

ALA POENTE

MEMÓRIA DESCRITIVA

A presente memória descritiva refere-se a um conjunto de trabalhos solicitados pela Reitoria da Universidade do Porto e a levar a efeito no Serviço de Contabilidade a funcionar no EX CICAP.

As obras constam essencialmente da criação de uma bateria de sanitários, de pinturas em parede e tectos, reforço de instalação eléctrica, substituição de ferragens deterioradas e instalação de um tecto falso acústico em dois compartimentos.

Importam estes trabalhos na quantia de esc: - 473 090\$00 (quatrocentos e setenta e três mil e noventa escudos).

Porto, 10 de Setembro de 1980

O Engenheiro Civil 1ª Clas.

Fernando de Pinho Noites

(Fernando de Pinho Noites)

FN/CM

VISTO

em 1 / 10 / 19 80
O ENG.º DIRECTOR

VISTO

em / / 19
O ENG.º DIRECTOR

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 DIRECÇÃO GERAL DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES
 DIRECÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ESCOLARES DO NORTE

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	Nº de partes iguais	Dimensões			Extensões Superfícies Volumes e Pesos		Precos unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
UNIVERSIDADE DO PORTO-REITORIA								
SERVIÇO DE CONTABILIDADE- APROVEITAMENTO DA ALA POENTE								
Artº 1º - Demolição de paredes interiores de alvenaria de tijolo, incluindo a remoção dos entulhos.	1				1	1	PE	3 000\$00
Artº 2º - Picar, rachear impermeabilizar e estanhar uma parede que se encontra com salitre, apenas pela face interior.	1				28,00	m2 28,00	600\$	16 800\$00
Artº 3º - Picagem de paredes interiores, incluindo novo reboco para receber azulejo até 2,00m de altura.	1				42,00	m2 42,00	400\$	16 800\$00
Artº 4º - Fornecimento e assentamento de azulejo branco de 15x15 de 1ª qualidade incluindo a execução de todos os remates.	1				42,00	m2 42,00	450\$	18 900\$00
Artº 5º - Alvenaria de tijolo vasado com 0,07m de espessura nos sanitários assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em volume.	1				27,00	m2 27,00	450\$	12 150\$00
Artº 6º - Raspagem e afagamento de todo o pavimento incluindo a tomação de juntas para posteriormente revestir a alcatifa.	1				140,00	m2 140,00	100\$	14 000\$00
					A Transportar			81 650\$00

Designação dos trabalhos	Nº de partes iguais	Dimensões			Extensões Superfícies Volumes e Pesos		Precos unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
					Transporte			81 650\$00
<u>Artº 7º</u> - Picagem do azulejo na antiga cozinha, incluindo novo reboco e a remoção de todos os entulhos.	1				30,00	30,00 m ²	450\$	13 500\$00
<u>Artº 8º</u> - Alvenaria de tijolo vasado de 0,07m de espessura no tapamento de vãos de portas.	1				8,00	8,00 m ²	450\$	3 600\$00
<u>Artº 9º</u> - Emboço e reboco interior com argamassa de cal hidráulica e areia ao traço 1:3 em volume, incluindo o guarnecimento a massa de areia.	1				16,00	16,00 m ²	350\$	5 600\$00
<u>Artº 10º</u> - Pintura a tinta plástica em paredes interiores novas e velhas, incluindo raspagem da tinta existente, amassamento e todos os retoques.	1				412,00	412,00 m ²	120\$	49 440\$00
<u>Artº 11º</u> - Pintura a tinta plástica em tectos, incluindo o tratamento das superfícies a pintar.	1				140,00	140,00 m ²	130\$	18 200\$00
<u>Artº 12º</u> - Fornecimento e assentamento de portas em estrutura de favo de abelha incluindo aros, maciços, garnições, ferragens idênticas à existente e duas demãos de tinta de esmalte sobre toda a superfície de madeira.								
					RA Transportar			171 990\$00

Designação dos trabalhos	Nº de partes iguais	Dimensões			Extensões Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
					Transporte			171 990\$00
Dimensões 0,70x2,00	4				4	4	7 500\$	30 000\$00
<u>Artº 13º</u> - Fornecimento e assentamento de novas fechaduras e puxadores para as portas existentes, incluindo afinações e possível corte das mesmas portas.	7				7	7	1 000\$	7 000\$00
<u>Artº 14º</u> - Fornecimento e assentamento de tomadas para aquecimento.	7				7	7	1 000\$	7 000\$00
<u>Artº 15º</u> - Fornecimento e assentamento de convectores iguais aos existentes de 1 500W.	7				7	7	5 000\$	35 000\$00
<u>Artº 16º</u> - Fornecimento e assentamento de tomadas e interruptores iguais aos existentes.	26				26	26	1 500\$	39 000\$00
<u>Artº 17º</u> - Fornecimento e assentamento de armaduras duplas com pendurais em latão cromado.	7				7	7	4 500\$	31 500\$00
<u>Artº 18º</u> - Idem, de armaduras simples	9				9	9	2 500\$	22 500\$00
<u>Artº 19º</u> - Idem, de armaduras circulares de 40W.	4				4	4	2 500\$	10 000\$00
					A Transportar			353 990\$00

MEDIÇÃO

ORÇAMENTO

Designação dos trabalhos	Nº de partes iguais	Dimensões			Extensões Superfícies Volumes e Pesos		Preços unitários	Importâncias
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Parciais	Totais	Materiais e Mão-de-obra	Materiais e Mão-de-obra
								Transporte 353 990\$00
<u>Artº 20º</u> - Execução das redes de abastecimento de água fria e esgotos nos quarto de banho, incluindo o fornecimento e assentamento de todos os acessórios;								
+ passadores, torneiras, sifões, etc, e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento do conjunto.	1				<u>1</u>	1	PE	30 000\$00
<u>Artº 21º</u> - Fornecimento e assentamento de bidets de 1ª qualidade incluindo ligações e todos os acessórios.	2				<u>2</u>	2	2 500\$	5 000\$00
<u>Artº 22º</u> - Idem, idem de bacias de retrete.	2				<u>2</u>	2	4 000\$	8 000\$00
<u>Artº 23º</u> - Idem, idem de lavatórios.	2				<u>2</u>	2	3 200\$	6 400\$00
<u>Artº 24º</u> - Idem, idem de cisternas em louça exterior para alimentação de retretes.	2				<u>2</u>	2	2 600\$	5 200\$00
<u>Artº 25º</u> - Fornecimento e instalação de tectos falsos acústicos, suspensos do tecto existente e constituídos por placas ^{de polpa} de madeira com acabamento especial fissurado e cantoneiras de apoio à vista, incluindo todos os cortes e remates.	1				<u>43,00</u>	43,00	1 500\$	64 500\$00
								473 090\$00

VISTO em 10 de Setembro de 1980
 O D. G. C. D. N. E. T. T.

fora, 10 de Setembro de 1980
 Fernando de Melo Antas

David Pereira Nunes & Filhos, L.^{da}

— ENCARREGAM-SE DE TODO O SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO CIVIL —
ESPECIALIDADE — TROLHA, PINTOR E VIDRACEIRO

AV. RODRIGUES VIEIRA, 7 TELEF. 952508 ARAÚJO-LEÇA DO BALIO



ORÇAMENTO Nº 59/80

Leça do Balio, 27 de Junho de 1980

À

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Rua de D. Manuel II

P O R T O

Assinatura

EXMOS SNRS:

Vimos pelo presente apresentar o n/ orçamento para a realização de varios trabalhos a levarem a efeito no Ex-CICAP na Rua de D. Manuel II - PORTO, no 2º pavimento da Reitoria da Universidade do Porto.

Os trabalhos são os seguintes:

Picar, rachear, cerezitar, endireitar, estanhar uma parede que se encontra com salitra.

Lavar, tomar, pintar a tinta plastica interior.

Picar o reboco existente, rebocar para receber azulejo até altura de 2 metros nos banhos.

Colocação de azulejo 15x15 branco até altura de 2 metros nos banhos.

Divisórias em tijolo 0,07 nos sanitarios.

Pintura dos tectos a tinta plastica.

Tectos falsos Amstrong nos compartimentos A, B, com perfil á vista.

Raspagem do pavimento para receber alcatifa (A alcatifa é fornecida pela reitoria).

Quatro (4) portas em placarol e pintura das mesmas pelas duas faces. Picagem do azulejo na antiga cosinha e rebocar.

Mudança de todas as fechaduras e puxadores.

Demolição de uma parede.

Tapagem de três portas a tijolo 0,07.

Reboco das mesmas portas.

Sete (7) tomadas para aquecimento.

Sete (7) convectores iguais aos existentes de 1 500 W.

Vinte e seis (26) tomadas e interruptores.

Sete (7) armaduras duplas com pendorais em latão cromado.

Nove (9) armaduras simples.

Quatro (4) armaduras circulares de 40 W. para os banhos.

Instalação de agua quente e fria para os sanitarios em tubo galvanizado

Dois (2) Bidés.

...../.....

Assinatura

David Pereira Nunes & Filhos, L.^{da}

— ENCARREGAM-SE DE TODO O SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO CIVIL —
ESPECIALIDADE — TROLHA, PINTOR E VIDRACEIRO

AV. RODRIGUES VIEIRA, 7 TELEF. 952508 ARAÚJO-LEÇA DO BALIO



.... /

Duas (2) Bacias.de retrete.
Dois (2) lavatórios.
Sifões e esgotos.
Dois canops.

Comprometemo-nos executar estes trabalhos pela quantia de esc:
478.000\$00 (QUATROCENTOS E SETENTA OITO MIL ESCUDOS).

Note Bem:

A alcatifa é por conta da Reitoria assim como a sua colocação.

Os preços desta empreitada ficam sujeitos a revisão em função das variações para mais ou para menos dos custos dos materiais e mão de obra segundo determina o decreto-lei nº 474/77 e nos termos do decreto-lei nº 273-B-75.

Sem Outro Assunto de momento ficamos a aguardar as respeitosas Ordens de V. Exc^o

Aceitamos em / / as condições desta proposta.

O Cliente.

De V. Exc^o
Atentamente.

David Pereira Nunes



Joaquim Correia & C.ª L.ª

TELEFONE. 51868

RUA DR. ALBERTO DE AGUIAR, 55-4300 PORTO

ALVARÁ(S) N.º(S) 3323

Porto, 3 DE JULHO DE 1980

EXM^{as}.

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

RUA D. MANUEL II

P O R T OExm^{as}. Senhores:

Vimos pela presente submeter à apreciação de V.Ex^{as}., um orçamento para os trabalhos de construção civil que pretendem mandar fazer para o APROVEITAMENTO DE PARTE DA ALA POENTE PARA EXPANSÃO DO SERVIÇO no (SERVIÇO DE CONTABILIDADE), de acordo com o desenho e condições que nos foram presentes e de que tomamos inteiro conhecimento, pela quantia de esc: 566.000\$00 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL ESCUDOS).

- O PRAZO previsto para a execução destes trabalhos é até ao fim do corrente ano.
- Este orçamento é válido por 15 dias.
- Os PAGAMENTOS, serão mensais de acordo com os trabalhos realizados.

Sem mais, ficando a aguardar o favor das presadas ordens de V.Ex^{as}., entretanto nos subscrevemos com elevada consideração e estima.

De V.Ex^{as}.

Muito atentamente,

Joaquim Correia & C.ª L.ª
 4300 PORTO

António Almeida e Silva & Ca., Lda.

EXECUÇÃO DE TODO O SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

RUA 31 DE JANEIRO — VILAR DO PARAÍSO — TELEF. 910382 — 4400 V. N. DE GAIA

Vilar do Paraíso, 1 de Julho de 1980

Ex.^{ma} Snr.:
Reitoria da Universidade do Porto
Rua de D. Manuel II

Antonio de Almeida e Silva & Ca Lda, com sede na rua 31 de Janeiro nº 35 Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia; depois de ter tomado inteiro conhecimento dos trabalhos a realizar no 2º pavimento "Serviço de Contabilidade", propõem-se executar os referidos trabalhos conforme peças escritas e desenhadas apresentadas, ressaltando e esclarecendo o seguinte:

- 1º - Não serão executados os tectos falsos "AMSTRONG", conforme indicações do Exmº Snr. Isablino.
- 2º - Retirar-seá todo o azulejo existente no sanitário e dependência ao lado que era utilizada como cozinha, sendo a paredes rebocadas e estucadas.
- 3º - Está incluído todas as ranhuras necessárias para picheleiro e electricista excepto a que terá de fazer-se para a manga de ar dos sanitários por motivo de se ter de estudar a melhor forma.
- 4º - Está incluído o fornecimento de sete convectores, vinte e seis pontos de luz, vinte e seis armaduras, trinta tomadas de aquecimento um quadro electrico e uma derivação.

O importe destes trabalhos é de esc.... 517.500\$00
(QUINHENTOS E DEZASSETTE MIL E QUINHENTOS ESCUDOS)

Aguardando as prezadas ordens de Vª Excª
Subscrevemo-nos atenciosamente

António Almeida e Silva & Ca., Lda.
ANTÓNIO ALMEIDA E SILVA & CA., L.ª
Rua 31 de Janeiro Vilar do Paraíso
Telef. 910382 4400 V. N. DE GAIA



Universidade do Porto

Reitoria

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

RUA DE D.MANUEL II

OBRAS A REALIZAR NO 29.PAVIMENTO - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

PAREDES INTERIORES - As paredes, depois de lavadas e retocadas, receberão duas demãos de tinta plástica "NOVAQUA-CIN".

No entanto a parede, a sul, danificada por acção de infiltrações de água e, em parte, "salitrada" terá de ser picada, cespitada e rebocada para receber o estuque e pintura.

As paredes dos sanitários serão revestidas de azulejo branco 0,15x0,15 m até 2,00 m de altura, sendo a superfície sobrance, pintada.

As paredes a criar serão formadas com tijolo vasado de 0,07 m.

TECTOS - Serão pintados com tinta plástica do tipo já mencionado; no entanto, nos compartimentos A e B serão montados tectos falsos "AMSTRONG" com suspensão à vista e painéis muito claros; estes tectos ficarão a 2,80 m do pavimento.

PAVIMENTO - O pavimento geral será raspado de modo a permitir a colagem de alcatifa (esta fora da empreitada).

O pavimento dos sanitários será executado com mosaico cerâmico.

PORTAS - As portas dos sanitários serão do tipo "PLACAROL", pintadas a esmalte nas duas faces.

FERRAGENS - As fechaduras e puxadores das portas existentes serão substituídas por outros da marca e tipo dos existentes nesta Secção de Contabilidade.

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - Será feita uma revisão geral à instalação eléctrica deste Sector de modo ao seu perfeito funcionamento e segurança. Os interruptores, tomadas, armaduras, aquecedores, etc., serão da qualidade e marca dos já existentes. Todas as armaduras de iluminação ficarão a 2,80 m do pavimento utilizando-se, na generalidade, suspensões metálicas.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Será aplicada louça VALADARES branca, sendo as bacias de retrete equipadas com cisternas exteriores "DILÚVIO". As peças sanitárias serão alimentadas com água fria e as torneias, passadores, etc. serão iguais aos existentes na Secção.

Porto, 4.6.1980



Universidade do Porto

Reitoria

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

RUA DE D.MANUEL II

OBRAS A REALIZAR NO 29.PAVIMENTO - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

PAREDES INTERIORES - As paredes, depois de lavadas e retocadas, receberão duas demãos de tinta plástica "NOVAQUA-CIN".

No entanto a parede, a sul, danificada por acção de infiltrações de água e, em parte, "salitrada" terá de ser picada, cersitada e rebocada para receber o estucado e pintura.

As paredes dos sanitários serão revestidas de azulejo branco 0,15x0,15 m até 2,00 m de altura, sendo a superfície sobranete, pintada.

As paredes a criar serão formadas com tijolo vasado de 0,07 m.

TECTOS - Serão pintados com tinta plástica do tipo já mencionado; no entanto, nos compartimentos A e B serão montados tectos falsos "AMSTRONG" com suspensão à vista e painéis muito claros; estes tectos ficarão a 2,80 m do pavimento.

PAVIMENTO - O pavimento geral será raspado de modo a permitir a colagem de alcatifa (esta fora da empreitada).

O pavimento dos sanitários será executado com mosaico cerâmico.

PORTAS - As portas dos sanitários serão do tipo "PLACAROL", pintadas a esmalte nas duas faces.

FERRAGENS - As fechaduras e puxadores das portas existentes serão substituídas por outros da marca e tipo dos existentes nesta Secção de Contabilidade.

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - Será feita uma revisão geral à instalação eléctrica deste Sector de modo ao seu perfeito funcionamento e segurança. Os interruptores, tomadas, armaduras, aquecedores, etc., serão da qualidade e marca dos já existentes. Todas as armaduras de iluminação ficarão a 2,80 m do pavimento utilizando-se, na generalidade, suspensões metálicas.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Será aplicada louça VALADARES branca, sendo as bacias de retrete equipadas com cisternas exteriores "DILÚVIO". As peças sanitárias serão alimentadas com água fria e as torneias, passadores, etc. serão iguais aos existentes na Secção.



Porto, 4.6.1990

APROVEITAMENTO DE PARTES DA ALA POSTERIOR
PARA EXPANSAO DO SERVIÇO.

PLANTA G.C. 1:100

AC-1120-1b

PARADA

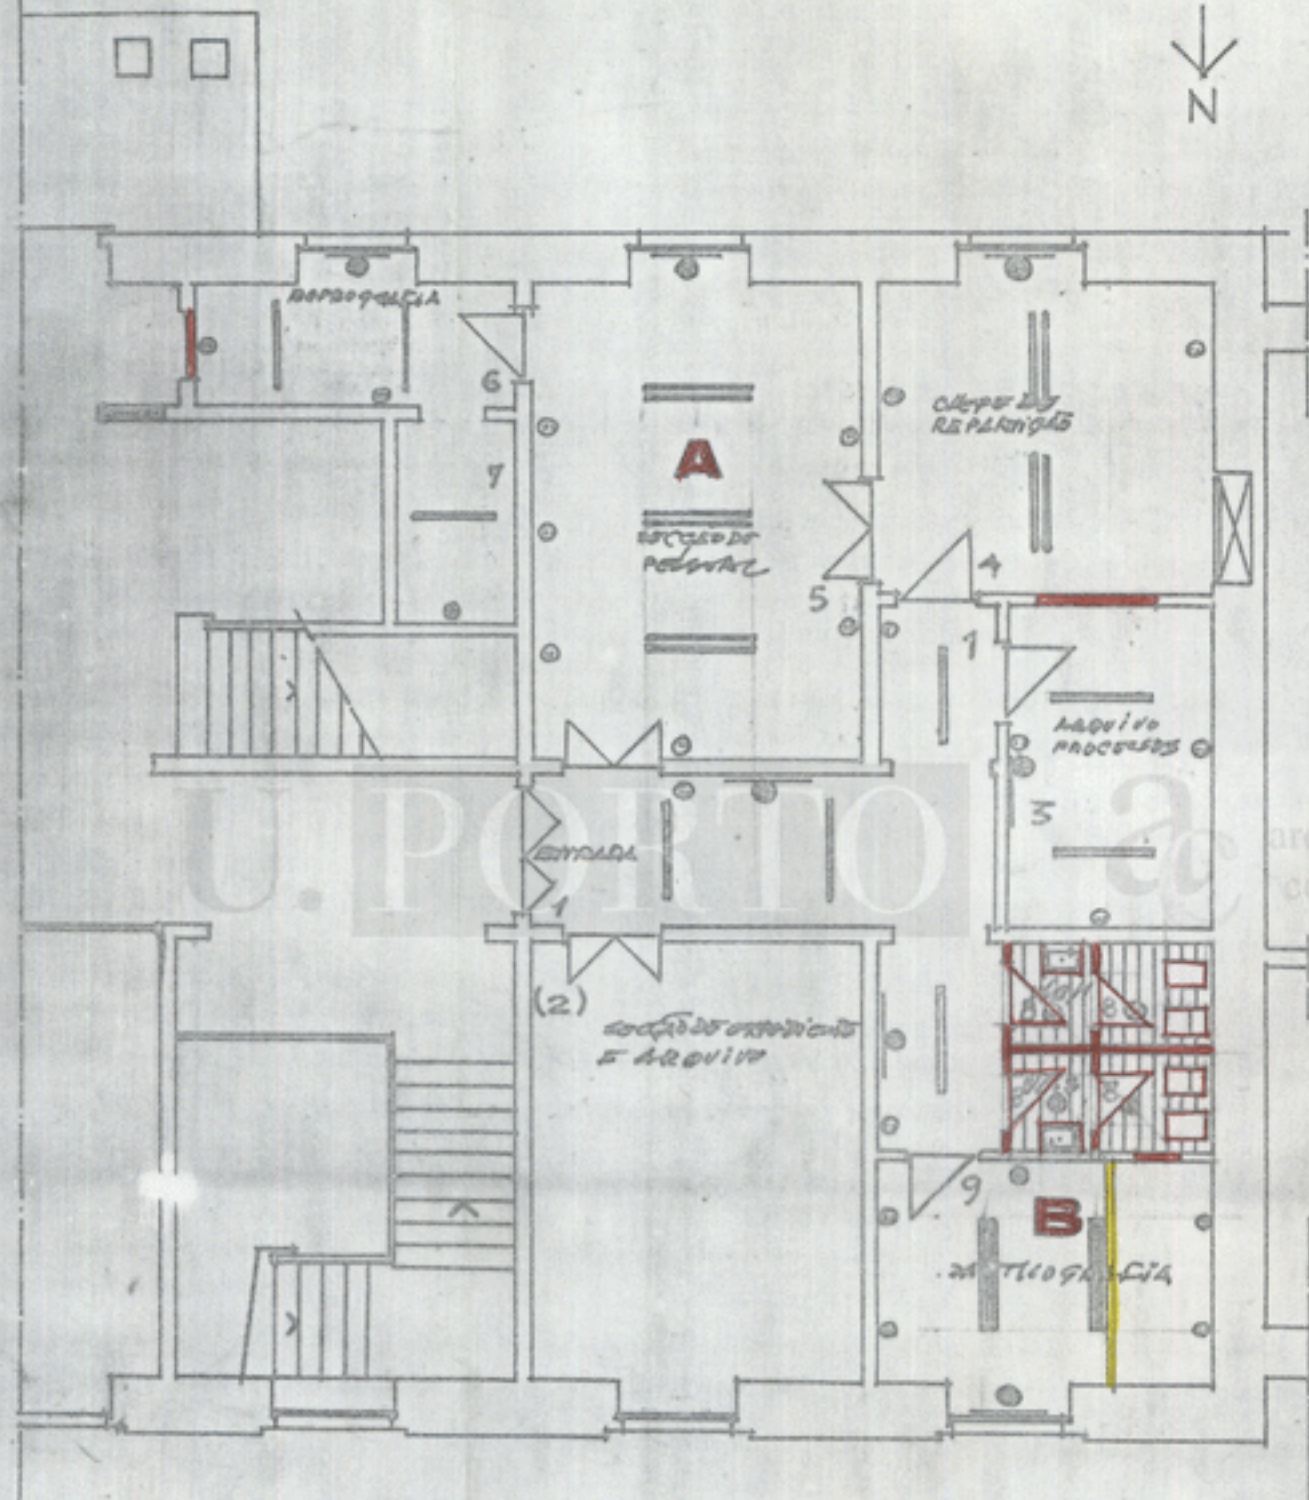

- ⊙ TOMADA - LUZ
- ⊙ " AQUECIMENTO
- L. FLUORESCENTE 40 W.
- IRRADIADOR 1.500 W.
- ⊙ L. IRRADIADOR COSTE
- A CONSTRUIR
- A DEMOUIR

N.B. - A SECCAO DE EXPEDIENTE
E ARQUIVO (2) NAO PRECISA
DE OBRAS.
